RELATÓRIO MENSAL
ABRIL/2026

BARRETOS
INTELIGENTE

GESTÃO POR MEIO DE PPP

BARRETOS
PREFEITURA

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO MENSAL

REFERENTE A Abril/2026

Objeto: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E USINA FOTOVOLTAICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

Data de assinatura: 11 de janeiro de 2023.
Município Atendido: Barretos/SP
Parque de Iluminação Pública: 23.615 pontos
Iluminação de Destaque: 528 equipamentos
Infraestrutura de Fibra Óptica: 80,7 km | 165 pontos na zona urbana
Infraestrutura de Rádio: raio de 31,3 km | 18 pontos na zona rural
Videomonitoramento: 84 câmeras em 40 pontos de monitoramento
WiFi público: 28 pontos | 10 usuários com no mínimo 5 Mbps ao mesmo tempo
Geração de Energia: 5.855.970,04 kWh/ano | atender 319 unidades consumidoras

Barretos, 12 de Maio 2026

À

PREFEITRUA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

CMOG – COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO

VERIFICADOR INDEPENDENTE – ERNST & YOUNG

Este Relatório visa apresentar as atividades dos compromissos acordados no CONTRATO DE CONCESSÃO nº 14-2023, referente aos SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E USINA FOTOVOLTAICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

Estamos à disposição para quaisquer modificações e/ou correções que se fizerem necessárias.

Responsáveis Técnicos:

Engº EDSON JOSE LOPES DAS NEVES

Engº FABRICIO MOREIRA MELLO RIBEIRO

Engº PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARAES

Engº PEDRO CICCI CUNHA CASTRO

Engº REGIS HONORIO

Engº JULIO JOSÉ ALVARES LOPES DAS NEVES

A IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A, responsável pela execução dos SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP, através de CONTRATO DE CONCESSÃO Administrativa nº 14-2023 na modalidade PPP (Parceria Público Privada) apresenta ao COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO - CMOG e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE relatório das suas atividades técnicas, realizadas no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

1. REGULARIDADES CONTRATUAL

1.1 Regularidade FGTS – ANEXO I

1.2 Regularidade Trabalhista e Previdenciária – ANEXO II

1.3 Regularidade Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal – ANEXO III

1.4 Garantia de Execução do Contrato – ANEXO IV


1.5 Relatório de Segurança

2. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1. Evolução Mensal da Taxa de Falha por região da cidade (norte, sul, leste, oeste, centro), desde julho/2023 - (ideal < 4%).

Regiões	Total de Pontos Cadastrados	Quantidade de Chamados/Atendimentos
Norte	4941	3406
Sul	7392	5522
Leste	5676	3445
Oeste	2974	2831
Centro	2610	1321
Total	23593	16525

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS						
Mês	Norte	Sul	Leste	Oeste	Centro	Total
Julho	391	450	185	291	85	1402
Agosto	388	417	260	263	241	1569
Setembro	305	319	275	193	107	1199
Outubro	208	452	304	233	80	1277
Novembro	216	360	185	220	76	1057
Dezembro	241	325	142	160	90	958
Janeiro	227	241	182	157	70	877
Fevereiro	140	216	115	152	61	684
Março	143	237	201	101	42	724
Abril	173	314	151	146	48	832
Maio	169	189	101	93	33	585
Junho	106	198	70	58	17	449
Julho	41	171	65	36	8	321
Agosto	37	94	37	33	19	220
Setembro	32	100	52	19	5	208
Outubro	36	78	53	38	21	226
Novembro	49	124	32	39	29	273
Dezembro	24	85	36	51	16	212
Janeiro	39	93	145	50	13	340
Fevereiro	30	52	70	51	16	219
Março	44	83	72	42	45	286
Abril	41	121	71	65	44	342
Maio	84	99	92	36	21	332
Junho	31	57	60	24	9	181
Julho	38	88	53	68	9	256
Agosto	17	50	39	19	13	138
Setembro	17	80	45	24	27	193
Outubro	20	42	37	26	22	147
Novembro	15	33	63	22	3	136
Dezembro	6	25	38	16	2	87
Janeiro	22	51	34	21	15	143
Fevereiro	26	136	72	40	12	286
Março	19	68	68	16	9	180
Abril	31	74	40	28	13	186

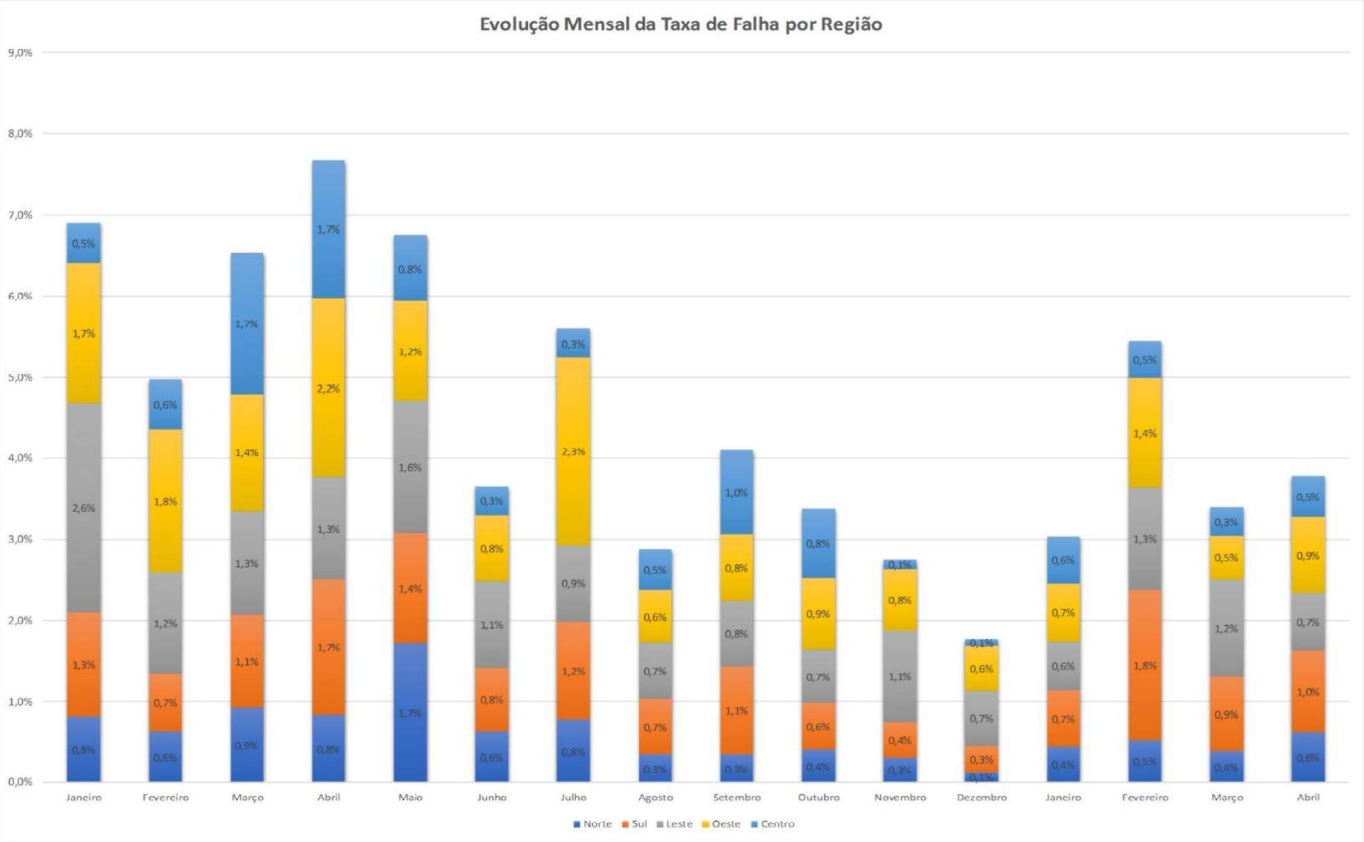


2.2. Evolução Mensal do número de chamados resolvidos por canal:

i. Call-Center 0800


ii. Aplicativo

iii. Site

iv. Ronda e Avulsos

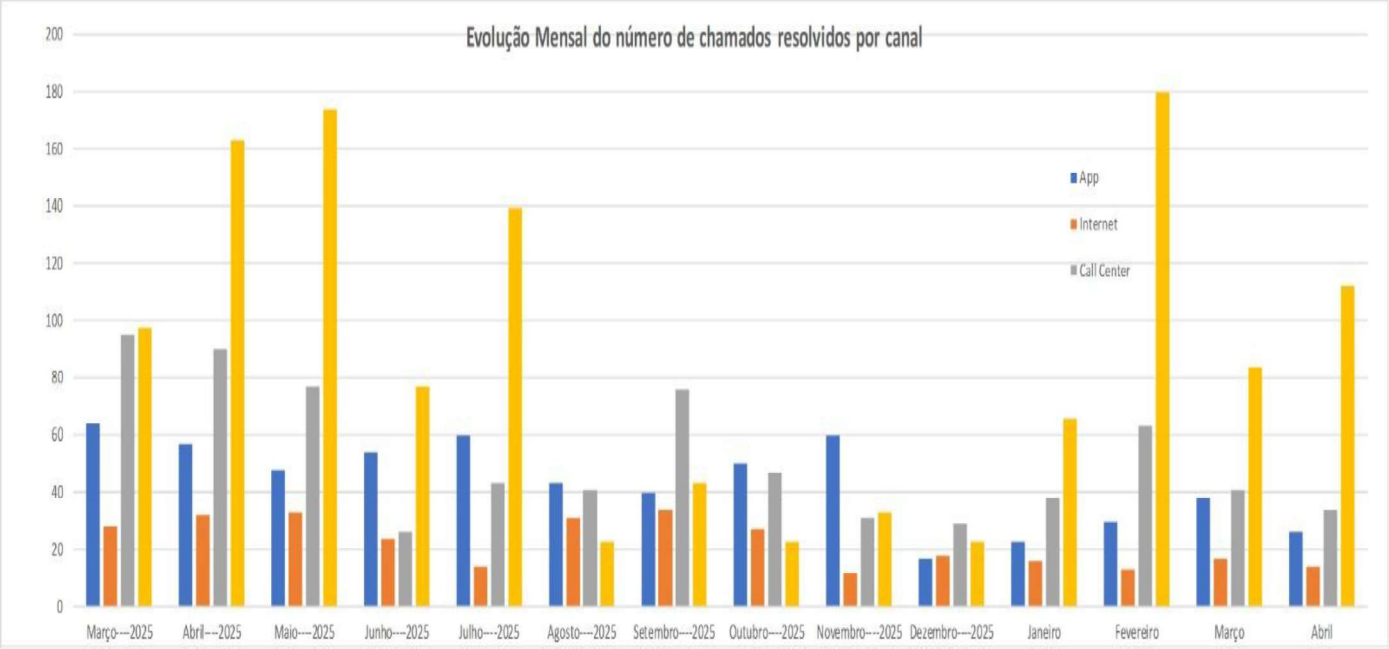

2.3. Evolução Mensal do Tempo Médio de Atendimento

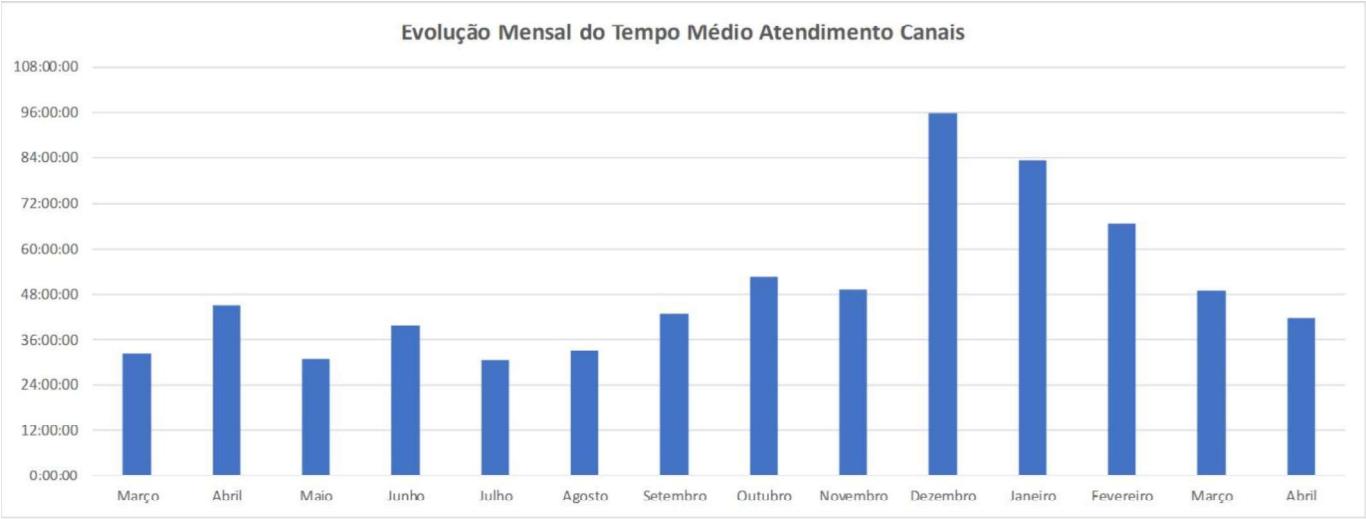

Prazo contratual: 168 horas.

3. IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED – 23.615 UNIDADES

a. Informação sobre o Projeto Executivo – Aprovação e dificuldades encontradas

Os projetos executivos da modernização do parque de IP foram concluídos e feitos com base na classificação das Vias informada no Termo de Referência do processo licitatório. A classificação das vias varia de V1 a V5 conforme a NBR5101/2018, sendo V1 classificada como as vias principais de grande fluxo de carros e V5 classificadas como vias locais de bairros com pouco fluxo de carros. Foram seguidas as classificações informadas no Projeto Básico do Edital, porém notamos que houve necessidade de reclassificações que informamos em 1º Ofício enviado ao CMOG em 12/03/24 e em 2º Ofício enviado ao CMOG em 11/07/24. Em 20/06/24, em resposta ao Ofício 040/24 do CMOG de 01/06/24, encaminhamos novas considerações a respeito das classificações das vias. Ao final dos projetos foram reclassificados 4.882 pontos de iluminação em diversas Ruas e Avenidas da cidade. Vamos elaborar os estudos para avaliar o impacto financeiro destas reclassificações.

Esclarecendo: por exemplo, Bairros inteiros como o San Diego, São Francisco, Jardim Califórnia, Jardim Anastácio e outros, onde a classificação de Via está como V5 no Edital, no local temos luminárias instaladas de 250W típicas de vias V2, assim, projetamos como V2 colocando luminárias de LED de 70W mantendo o equilíbrio de luminosidade, e ainda com economia de 75% do consumo de energia. Ao contrário, se projetarmos como V5 como está no Termo de Referência, colocaríamos luminárias LED de 30W, atenderia a Norma 5101, mas diminuiria em muito a iluminância média o que causaria insatisfação muito grande dos munícipes que já estão habituados com uma luminosidade melhor. **Região central, outro exemplo, teríamos a maioria como V5 e foram reclassificadas para V2**. Não são casos isolados e sim bairros inteiros. Há muitos outros bairros na mesma situação.

As reclassificações de Vias demandam luminárias de maior potência do que as originalmente previstas no Edital e, portanto, serão objeto de Reequilíbrio Econômico-Financeiro – REF. Para além do investimento maior em luminárias, também haverá maior consumo de energia,

consequentemente a apuração da Bonificação de Desempenho Energético (BDE) também será menor havendo necessidade de recomposição.

REF é um procedimento muito comum em projetos modelo PPP. Chegamos ao final da modernização das vias e não ocorreram novas reclassificações.

No quadro abaixo temos as potências das luminárias que foram entregues pelo fabricante até 28/11/24 atendendo à demanda de projetos. Devido à não reclassificação de novas vias, e seguindo os projetos originais do Edital, onde temos grande quantidade de Vias V5, destaca-se a luminária de 30W:

luminárias entregues até 28/novembro/24										
pot (W)	lote 1	lote 2	lote 3	lote 4	lote 5	lote 6	lote 7	lote 8	lote 9	TOTAL
30W	1010	1767		500	1500	500		656	26	5959
40W		505							4	509
50W		505		200	500	800	1000		20	3025
60W		505							1	506
70W	1010	1155	2000	1500	200				279	6144
80W	1010									1010
90W		252		800	400		150	362	164	2128
110W		121								121
120W		232		600	500		350	911	163	2756
TOTAL	3030	5042	2000	3600	3100	1300	1500	1929	657	**22158**

Em 28/11/25 recebemos o ÚLTIMO lote (9) destinado a modernizações de praças, futuras expansões e manutenções.

Foram encaminhadas à CPFL até 31/maio, 71 lotes de substituições feitas para a atualização do cadastro e contas de consumo. **Estamos aguardando a finalização das atualizações e o impacto nas novas contas de consumo**. **Até 31 de maio/25 as contas da CPFL apresentavam redução de consumo de 60,95% - Anexo VI.**

b. Quantitativo implantado (Cronograma x Realizado)

Resumo do realizado nas substituições para modernização com LED até 31/dezembro:

resumo modernização até Abril/26	
Total de Pontos Luminosos EDITAL	23.615
Total de Pontos Modernizados:	23714
Redução de Pontos	2419
Pontos instalados LED	21295
Percentual Modernizado no período	100,42%
Percentual Redução de Carga:	76,00%
Carga anterior (kWatt)	5694,13
Carga instalada (kWatt)	1366,384

Notar que a eficientização do parque de IP, além da redução do consumo de energia e outros benefícios da tecnologia LED, promoveu uma redução de 2.419 luminárias.

Do total de luminárias retiradas do parque de IP (23.714), temos:

- Vapor de sódio e Vapor metálico: 22.120 – LED: 1.594

Destacamos que já ultrapassamos a quantidade de luminárias modernizadas estipuladas no Edital, superando em 99 luminárias, ou seja, 100,42%.

Temos ainda alguns casos de luminárias que não foram modernizadas que se concentram em praças e rotatórias. As chuvas também impossibilitam a entrada dos caminhões nas praças pois danificam os gramados. Outros impedimentos como presença de abelhas nos postes/estruturas, próximos de rede primária (alta tensão) e necessidade de poda de árvores.

Vias Públicas do município já estão ***100% modernizadas***.

A Concessionária encaminhou regularmente os relatórios e documentos necessários para aferição dos indicadores referentes ao mês de **março de 2026**, incluindo o relatório de gravação de imagens e os dados operacionais atualizados, devidamente enviados em **06/04/2026**, estamos usando a mesma base já que não ocorreu a extração esse mês, devido ao não agendamento do verificador contemplando as informações utilizadas para avaliação dos indicadores técnicos.

Os indicadores objetivos de desempenho da rede apresentaram conformidade no período, destacando-se o Indicador de Velocidade Média de Conexão (IVC), que registrou **0% de não conformidade**, conforme aferições realizadas no ciclo vigente, em linha com o padrão de desempenho esperado para o sistema.

No que se refere ao Indicador de Satisfação do Serviço RD (ISS-RD), a nota atribuída decorre de uma pesquisa com apenas 7 respostas, das quais 4 foram classificadas como “Bom”, resultando em 57,14% de avaliação positiva.

Nesse contexto, entende-se que a pontuação atribuída não reflete de forma representativa o desempenho efetivo do serviço no período, considerando a amostragem extremamente reduzida e a ausência de detalhamento da metodologia utilizada para aplicação da pesquisa, incluindo critérios de seleção, abrangência e forma de coleta dos dados.

Adicionalmente, a análise técnica das ordens de serviço evidencia que os registros operacionais contemplam ocorrências de naturezas distintas, incluindo situações não relacionadas diretamente à qualidade da rede, o que reforça a necessidade de avaliação integrada dos indicadores e da correta classificação das ocorrências.

Diante do exposto, a Concessionária apresenta contestação quanto à nota atribuída ao ISS-RD, por entender que os critérios adotados não asseguram representatividade estatística nem aderência às boas práticas de avaliação de desempenho.

Reitera-se, por fim, o compromisso da Concessionária com a transparência, a qualidade dos serviços prestados e a melhoria contínua dos processos operacionais, permanecendo à disposição para esclarecimentos adicionais e para análise técnica conjunta dos dados apresentados.

4. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO (BDE) e Índice de Eficientização (IE)

A Bonificação de Desempenho Energético (BDE) vem sendo apurada conforme os critérios contratuais estabelecidos, considerando a economia de energia efetivamente comprovada no período avaliado. O valor do bônus tem sido calculado com base na diferença entre o consumo inicial de referência e o consumo eficientizado após a modernização do parque de iluminação, refletindo o desempenho alcançado pela Concessionária na redução do consumo energético.

Premissas e Metodologia de Cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE)

a.Base conceitual do cálculo

O cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE) fundamenta-se na comparação entre o **Consumo Específico Original (CE_o)** e o **Consumo Específico Efetivo (CE_ef)** do parque de iluminação pública, após a implantação das ações de eficientização energética.

b.Índice de eficiência energética (EE)

A eficiência energética é apurada por meio da seguinte relação:

- $EE = 1 - (CE_ef / CE_o) \times t \times 100\%$

  Onde *t* representa o fator de ajuste proporcional à variação da potência instalada (ip_t / ip_o).

c.Cálculo do consumo específico médio

O consumo específico médio considera a relação entre consumo de energia e potência instalada:

- $CE_{mo} = CE_o / ip_o$
- $CE_{me}f = CE_ef / ip_t$

d.Apuração do percentual de eficiência alcançado

Aplicando os valores apurados no período de referência, foi identificado um **percentual de eficiência energética de 76,29%**, superando a meta mínima contratual.

e. Cálculo da energia efetivamente economizada

A energia economizada (kWh) é calculada pela diferença entre o consumo original e o consumo efetivo, multiplicada pelos dias do mês e pelo tempo médio de operação:

- Energia Economizada (kWh) = $(CE_o - CE_ef) \times$ nº de dias $\times T_{mi}$

Premissas e Metodologia de Cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE)

Base conceitual do cálculo

O cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE) fundamenta-se na comparação entre o Consumo Específico Original (CE_o) e o Consumo Específico Efetivo (CE_ef) do parque de iluminação pública, após a implantação das ações de eficientização energética.

Índice de eficiência energética (EE)

A eficiência energética é apurada por meio da seguinte relação:

$$EE = 1 - (CE_ef / CE_o) \times t \times 100\%$$

Onde t representa o fator de ajuste proporcional à variação da potência instalada (ip_t / ip_o).

Cálculo do consumo específico médio

O consumo específico médio considera a relação entre consumo de energia e potência instalada:

$$CE_{mo} = CE_o / ip_o$$

$CE_{me}f = CE_ef / ip_t$

Apuração do percentual de eficiência alcançado

Aplicando os valores apurados no período de referência, foi identificado um percentual de eficiência energética de 76,29%, superando a meta mínima contratual.

Cálculo da energia efetivamente economizada

A energia economizada (kWh) é calculada pela diferença entre o consumo original e o consumo efetivo, multiplicada pelos dias do mês e pelo tempo médio de operação:

Energia Economizada (kWh) = $(CE_0 - CE_ef) \times$ nº de dias $\times T_{mi}$

Definição da meta de economia contratual

A meta de economia corresponde a 60% do consumo original, conforme previsto contratualmente:

Meta de Economia (kWh) = $CE_0 \times 60\% \times$ nº de dias $\times T_{mi}$

Cálculo do excedente de economia

O excedente passível de bonificação corresponde à diferença positiva entre a energia economizada e a meta contratual:

Excedente = Energia Economizada − Meta de Economia

Cálculo do valor financeiro da bonificação

O valor do repasse financeiro é obtido pela aplicação do percentual de excedente sobre a tarifa média do período:

Valor do Repasse (R$) = Excedente × % Excedente × Tarifa média mensal

Parâmetros tarifários e temporais

Foram considerados:

Tarifa média mensal aplicável ao período;

Quantidade de dias de cada mês;

Tempo médio diário de funcionamento do parque de iluminação.

Validação técnica

As premissas, fórmulas e resultados do cálculo foram avaliados e validados pelo Verificador Independente, servindo de base para a deliberação administrativa do CMOG.

Para o período avaliado, foram considerados os seguintes critérios:

- **Mês avaliado:** Abril
- **Quantidade de dias:** conforme mês civil
- **Tarifa de energia elétrica:** composta pelos componentes tarifários **TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição)** e **TE (Tarifa de Energia)**, conforme faturas da concessionária de energia elétrica, **sem inclusão de tributos**, encargos ou retenções fiscais;
- **Tarifa de energia com tributos:** utilizada apenas para fins informativos, não integrando a base de cálculo da bonificação;
- **Valor Inicial (kWh):** correspondente ao consumo de referência do parque de iluminação pública;

- **Valor Eficientizado (kWh):** correspondente ao consumo efetivo após a implantação das medidas de eficiência energética;
- **Valor Economizado (kWh):** diferença apurada entre o consumo de referência e o consumo eficientizado;
- **Meta de Economia:** fixada contratualmente em **60%** do consumo de referência;
- **Percentual de eficiência energética (EE):** mantido em **76,29%**, uma vez que não houve alteração na potência instalada (kW) nem nos parâmetros operacionais do parque.



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CPFL ENERGIA

MUNICIPIO DE BARRETOS
RUA 30 564
CENTRO
14780-120 BARRETOS SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	-		1/2	05/05/2026	04/05/2026	28/05/2026

Classificação: Convencional B4a Sum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

PMB PRACA PRIMAVERA
PCA PRIMAVERA, S/N1 RUA 16 ESQ 33
CENTRO BARRETOS - SP
14780-670
CNPJ: 44.780.609/0001-04

Código da Instalação: 28084209

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
01/04/2026	04/03/2026	28

Próxima leitura 04/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 036638070 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 29/04/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://nfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe3e/Consulta
chave de acesso:
35260413052196000188660000366380701065644025
Protocolo de autorização: 335260008878829 0 30.04.2026 às 01:44:31

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	28/05/2026	R$ 1.238,53

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 7,72 TE R$ -33,74

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,96 e CBS (0,90%) R$8,67. Sem cobrança ao cliente.

Consumo / kWh

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 27 Dias
Verde 01 Dia

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 036638070 Série 0	330000231739	1.238,53	28/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você
CASAS BAHIA LOJA 1033 — PRAÇA FRANCISCO BARRETO 352 - CENTRO
EZEQUIAS GONCALVES FRUJUELLE ME — AV 17, 672 - CENTRO
J.P. CITY CONFECCOES — AV 23, AP 57 806 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836900000123 385300403156 536727725031 300002317398

cpfl paulista

Mês avaliado	#dias	Tarifa de Energia - TUSD	Tarifa de Energia - TE	Tarifa de Energia (com tributos)	Valor Inicial (KWH)	Valor Eficientizado (KWh)	Valor Economizado	Meta de Economia	Bonificação de Desempenho Energético
mar/25	31	0,26261905	0,23	0,49261905	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	96873,72
abr/25	30	0,26255814	0,23023256	0,4927907	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	93781,42
mai/25	31	0,26596492	0,22491229	0,49087721	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	96531,18
jun/25	30	0,27791667	0,20583334	0,48375001	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	92060,92
jul/25	31	0,27468086	0,20340426	0,47808512	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	94015,61
ago/25	31	0,27206897	0,20137932	0,47344829	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	93103,78
set/25	30	0,27955556	0,20688889	0,48644445	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	92573,69
out/25									
nov/25									
dez/25	31	0,27805346	0,20587003	0,48392349	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	95163,73
jan/26	31	0,27695168	0,20505577	0,48200745	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	94786,94
fev/26	28	0,2566309	0,20505577	0,46168667	1817330,077	430899,224	R$ 1.386.430,85	R$ 1.090.398,05	82004,64
mar/26	30	0,27456411	0,20328206	0,47784617	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	90937,38
abr/26	31	0,27767155	0,20558597	0,48325752	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	95032,77

5. Receita Acessória – 4º Aditamento Contratual

O documento referente aos links de internet permanece em fase de revisão pelo Sr. Luiz Buch, com posterior encaminhamento ao Verificador Independente. Paralelamente, a equipe de Tecnologia da Informação do Poder Concedente vem analisando as divergências identificadas nos valores e nas datas apresentadas.

Destaca-se que, no decorrer das reuniões técnicas realizadas entre as partes, foram promovidos alinhamentos quanto ao tratamento desses apontamentos, tendo sido consensuada a condução dos valores pendentes no âmbito do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme os mecanismos contratuais aplicáveis.

Registra-se, ainda, que o referido tema será formalizado em ata do CMOG na reunião prevista para o dia **21/05/2026**, para fins de registro e acompanhamento.

6. Usinas Fotovoltaicas

No que se refere às Usinas Fotovoltaicas, informa-se que as unidades instaladas no Centro de Reabilitação e no SAMU encontram-se em operação, já em fase de geração de energia.

Adicionalmente, há mais dois locais aprovados para implantação, cujos projetos encontram-se tecnicamente viabilizados. As respectivas implantações estavam condicionadas à definição quanto à forma de pagamento das estruturas do tipo carport, cuja execução demanda formalização prévia para viabilização do investimento.

Destaca-se que, no âmbito das tratativas realizadas entre as partes, foi definida a forma de pagamento aplicável, estando o tema previsto para registro em ata do CMOG na reunião do dia **16/04/2026**, para fins de formalização e acompanhamento.

A Concessionária permanece à disposição para dar prosseguimento às implantações, conforme os encaminhamentos e formalizações decorrentes.

A Concessionária permanece à disposição para dar imediato prosseguimento às obras tão logo haja definição quanto ao modelo de pagamento e formalização necessária.

LOCAL	KWP
PMB SAU CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	79,2
PMB SAU POSTAO	138,6
E.M. JOAO BARONI	77
PMB SAMU	24,2
PMB SAU UBS MARILIA	51,7
PMB SAU UPA	121,55
TOTAL	492,25

Para ciência, o Termo de Referência, Anexo I do Contrato de Concessão, prevê o seguinte:

6. DA(S) USINA(S) FOTOVOLTAICA(S) DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (UFV)

6.1. Neste capítulo é apresentado o escopo do projeto de implantação, operação e manutenção de uma UFV de geração distribuída que deverá ser implantada em local do PODER CONCEDENTE, para suprir parcialmente a demanda energética das edificações públicas municipais. A projeção total de geração de energia elétrica da UFV de geração distribuída é de no mínimo 5.855.970,04 kWh (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta inteiros e quatro centésimos).

6.2. A CONCESSIONÁRIA poderá selecionar outro local para instalação da UFV, mediante aprovação do PODER CONCEDENTE, desde que as informações do Parecer de Acesso emitido pela distribuidora local indiquem a inviabilidade do local selecionado.

6.1.2. Memorial Descritivo

.....

A UFV poderá ser instalada em solo ou em telhados através de estruturas metálicas, com inclinação em relação ao horizonte e desvio do Norte

Geográfico a serem definidos. Ela é composta por módulos solares ligados em série/paralelo .....

Lembramos que o CMOG, em seu Relatório de Desempenho da Concessionária encaminhado em 24/10/24, cita em seu item 5:

O Poder Concedente autoriza os estudos a fim de que as placas fotovoltaicas sejam nos telhados dos prédios públicos.

O Poder Concedente pediu parecer ao Verificador Independente em 6/março/25 sobre as instalações de placas fotovoltaicas em telhados, cuja resposta foi enviada em 17/março/25.

7. Telegestão

A instalação do sistema de telegestão foi concluída em aproximadamente 21 mil pontos devido a retirada de praças que entra em conflito com as contatoras que matem os refletores ligados no período ajustado, encontrando-se em pleno funcionamento, com aplicação de dimerização. Ficou alinhado que a Prefeitura poderá indicar locais e horários específicos para otimização do consumo energético.

8. Pontos de Wi-Fi

Foi registrado que quatro pontos de Wi-Fi encontravam-se inoperantes no período analisado. A situação foi devidamente tratada pela equipe técnica, com a realização de verificações de conectividade, ajustes de configuração e reconfiguração dos equipamentos.

Na sequência, foram **implantados novos hotspots nos locais previstos**, medida que possibilitou o restabelecimento e a ampliação da disponibilidade do serviço.

A Concessionária realizou os testes operacionais e as validações necessárias, de modo a assegurar a normalização e a estabilidade do sistema após a conclusão das instalações, conforme evidenciado nos registros anexos.

9. Expansão do Parque de Iluminação

O Contrato de Concessão estabelece meta anual de expansão de 219 pontos. No exercício de 2025, essa meta foi superada, totalizando 279 novos pontos instalados.

O quantitativo excedente de 60 unidades ultrapassa a meta contratual originalmente prevista para o período. Conforme alinhamento realizado com o Poder Concedente, esse excedente foi **reprogramado para o exercício de 2026**, passando a compor a meta física do referido ano.

Dessa forma, o exercício de 2026 foi iniciado já com a **incorporação dos pontos excedentes provenientes de 2025**, conforme demonstrado na tabela a seguir, refletindo a antecipação de metas e a continuidade do plano de expansão.

Ressalta-se que essa reprogramação não configura ampliação contratual imediata, mas sim a **realocação de metas previamente executadas**, com posterior formalização por meio dos instrumentos administrativos cabíveis, assegurando a adequada compatibilização do cronograma físico-financeiro da concessão.

Novas demandas de expansão permanecem sujeitas à análise técnica e deliberação da Secretaria de Obras, observando os critérios de priorização e planejamento municipal.

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA - Atendimento a Expansões															
previso/realizado	2025	2025												%	Qtde.
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
PREVISTO EXPANSÕES	219	219 - crescimento anual												100%	219
REALIZADO	287	95	27	17	0	0	6	0	23	111	0	8	0	131,1%	287

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA - Atendimento a Expansões															
previso/realizado	2026	2026												%	Qtde.
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
PREVISTO EXPANSÕES	219	219 - crescimento anual												100%	219
REALIZADO	213	76	45	41	51									97,3%	213

Acompanhamento das Expansões – Exercício 2026

Conforme cronograma de referência para atendimento às expansões previsto para o exercício de 2026, a meta anual estabelecida corresponde a 219 pontos.

Até o presente momento, a concessionária já executou 213 pontos, representando 97,3% de atendimento da meta anual, demonstrando que estamos muito próximos de atingir integralmente o volume previsto para todo o ano, mesmo antes do encerramento do período contratual de referência.

Diante deste cenário, destaca-se que, uma vez atingido o quantitativo anual pactuado, qualquer nova solicitação de expansão ou instalação de pontos adicionais fora do volume originalmente previsto deverá ser tratada como atendimento excedente ao escopo base contratado.

Assim, os pontos implantados além da meta anual deverão ser objeto de apuração individualizada e correspondente cobrança por ponto adicional executado, considerando os custos de materiais, mão de obra, mobilização, equipamentos e demais impactos operacionais, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

9.a Qualitativo implantado – Indicadores de Iluminação Pública

No mes de fevereiro foram feitas as aferições referentes às modernizações realizadas no trimestre julho/agosto/setembro.

Total de aferições: 315

Com a presença do VI: 50

Somente Concessionária: 265

b. Demanda Reprimida da Iluminação Pública

Não foram realizadas demandas reprimidas

c. Descarte de lâmpadas

No mês de abril não tivemos descarte de materiais.

O Relatório de Modernização que extraímos de nosso Sistema e encaminhado mensalmente ao Verificador Independente e ao Poder Concedente apresenta resumidamente para o período de **janeiro/2024 a abril/2026** o seguinte quadro ao qual estamos contabilizando:

resumo modernização até Abril/26	
Total de Pontos Luminosos EDITAL	23.615
Total de Pontos Modernizados:	23714
Redução de Pontos	2419
Pontos instalados LED	21295
Percentual Modernizado no período	100,42%
Percentual Redução de Carga:	76,00%
Carga anterior (kWatt)	5694,13
Carga instalada (kWatt)	1366,384

10. IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – 36 locais e 535 pontos

Em decorrência das inviabilidades técnicas e operacionais identificadas em parte dos pontos de destaque originalmente previstos, foi acordada, junto ao Poder Concedente, a substituição desses pontos pela implantação de novos pontos de iluminação nos entornos dos lagos do município, assegurando o cumprimento das metas contratuais e a equivalência técnica das intervenções.

As obras tiveram início no final do mês de dezembro, encontrando-se, até a presente data, em fase avançada de execução, com frentes de serviço já implantadas e em operação parcial.

Ressalta-se que a execução dos serviços segue o cronograma ajustado, sendo que, no próximo mês, será apresentada tabela comparativa contendo o detalhamento dos pontos executados, substituídos e remanescentes, de forma a permitir o acompanhamento técnico e administrativo da evolução do escopo.

Destaca-se, por fim, que tais adequações não impactam os critérios de cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE), permanecendo válidos os parâmetros técnicos e metodológicos já aprovados.

Com relação ao quantitativo executado, registra-se que, do total de **536 pontos considerados no escopo atualizado**, **424 já foram executados**, incluindo **52 pontos implantados nos entornos dos lagos**, os quais substituíram pontos originalmente previstos. Restam, portanto, **112 pontos para a conclusão integral do escopo**.

Esclarece-se que, em comunicação anterior, foi informado quantitativo divergente em função de atualização de base de dados ainda em consolidação à época. Pedimos desculpas pelo desencontro de informação e reforçamos que os dados ora apresentados refletem a posição atualizada e validada.

Os pontos remanescentes correspondem, majoritariamente, a locais onde não foi possível realizar a implantação, em razão de ausência de autorização, intervenções em andamento, inexistência de infraestrutura elétrica próxima ou inviabilidade técnica.

11. IMPLANTAÇÃO DA INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – 115 PRÉDIOS

Concluímos 148 links de internet (alguns prédios estão com backup) superando em 28,69% o previsto de 115 conexões, o que será motivo de reequilíbrio econômico-financeiro-REF.

11. IMPLANTAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO – 84 CÂMERAS

As instalações e as conexões das 84 câmeras ao CCO de Segurança da Prefeitura em 41 pontos distintos na cidade foram concluídas.

As pendências de gravação de 30 dias de armazenamento de imagens foram solucionadas e temos pleno cumprimento do contrato.

12. **Monitoramento Rural**

No âmbito do projeto de monitoramento rural do município, informa-se que foi iniciada a implantação dos primeiros pontos de monitoramento na região da Cachoeirinha, contemplando a instalação da infraestrutura necessária para operação do sistema.

Na sequência do cronograma de implantação, foram realizados avanços no Distrito de Alberto Moreira, com a **implantação de pontos de monitoramento em dois locais**, dando continuidade à expansão do sistema nas áreas rurais.

Atualmente, as frentes de serviço encontram-se direcionadas para a região de **Ibitu**, onde terão início as próximas etapas de implantação, com o objetivo de ampliar a cobertura de segurança e apoiar as ações de vigilância no município.

9 CONCLUSÃO

No período avaliado, foi mantida a continuidade das atividades de operação e manutenção do parque de iluminação pública, com a realização de rondas periódicas para verificação do estado geral do parque, execução das manutenções corretivas e preventivas necessárias e planejamento das próximas atividades, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato de Concessão.

Ressalta-se que a pendência remanescente refere-se à implantação da telegestão no distrito, cuja execução está prevista para a próxima etapa do cronograma.

O sistema encontra-se em pleno funcionamento na área urbana, permitindo o monitoramento individualizado do consumo energético, o registro de horas de funcionamento, a detecção de falhas em tempo real e a gestão remota de cada ponto de iluminação, contribuindo diretamente para a eficiência operacional e energética do parque.

A funcionalidade de dimerização (redução automática da potência luminosa em períodos específicos) já está disponível e será configurada em etapas, conforme definição conjunta com o Poder Concedente, visando ampliar a eficiência energética e reduzir o consumo.

Em março/24 tivemos o início da modernização da iluminação pública em maior escala avançando por todos os bairros da cidade atingindo no final de maio o total de 21.278 luminárias LED instaladas em substituição a 23.685 luminárias modernizadas, portanto redução de 2.407 luminárias no parque de iluminação, contribuindo para a redução do consumo de energia.

A modernização até 31/10/25 de **23.714** luminárias representa **100,42%** da meta do Edital de **23.615** luminárias, superando em 70 luminárias. No cadastro atualizado temos o total de no parque de IP com 23.375 luminárias e projetores incluindo praças, rotatórias, destaque e vias públicas.

Importante frisar que todas as substituições de luminárias seguem projetos luminotécnicos elaborados em conformidade com a NBR 5101/2018 conforme consta em contrato. Os projetos têm indicado que, mesmo com a redução de luminárias em diversos pontos, temos uma melhoria acentuada de iluminância e uniformidade proporcionando aos munícipes mais segurança e conforto além de contar com índices de defeitos em luminárias LED baixíssimos, menos de 0,5%, diferente das luminárias com lâmpadas de descarga cujos índices estão próximos de 5%.

Resumidamente, atendimentos realizados

Manutenção 01 a 30 Abril	
OS atendidas por canais no prazo	75
OS atendidos canais fora do prazo	0
OS atendidas por ronda	45
OS atendidas avulso	66
OS Modernização	63
Total	249
Média tempo de atendimento canais	**41:21:10**
OS pendentes canais no prazo	2
OS pendentes canais vencidas	0
OS pendentes ronda	0
Total	2
Ronda feita ate 10/01	6350
Defeitos encontrados ronda	423
Percentual	6,66%

Podemos observar que desde o início efetivo da atuação desta Concessionária em julho/2023, as quantidades de chamados dos munícipes e as intervenções no parque de IP já diminuíram significativamente.

Em acordo ao Contrato de Concessão 14/2023, conforme estabelecido no ANEXO 3 DO CONTRATO – CADERNO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIAS, em seu capítulo 2, PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL (PRM), deve ser aplicado reajuste inflacionário anual no percentual de **4,83%**, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), **período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025**, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Assim, temos a atualização da Parcela de Remuneração Mensal (PRM):

• PRM anterior: R$ 803.555,36

• PRM reajustada: R$ 842.356,56

O pleito de reajuste foi protocolado sob nº 1102/2025, em 17/01/2025, tendo sido deferido em 05/06/2025.

Dessa forma, as Notas Fiscais referentes aos serviços passaram a ser emitidas com base na PRM reajustada, observadas as condições estabelecidas, incluindo a exclusão dos serviços de usina solar fotovoltaica, que representam 32,26% da PRM, conforme disposto no Ofício CMOG nº 029/2024, de 27/03/2024.

Ressalta-se que, adicionalmente à PRM, foi realizada a medição e faturamento da Bonificação de Desempenho Energético (BDE), conforme critérios contratuais vigentes e parâmetros técnicos previamente aprovados.

Assim, foram emitidas as seguintes Notas Fiscais:

NF nº 50 – R$ 120.911,68 – Serviços de Videomonitoramento;
NF nº 51 – R$ 462.201,04 – Serviços de Iluminação Pública;
NF nº 52 – R$ 95.032,77 – Parcela da Bonificação de Desempenho Energético (BDE), referente à competência de abril de 2026.

ANEXO I

Regularidade FGTS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.023.977/0001-13

Razão Social: IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A

Endereço: AV SEICHO-NO-IE 420 / DISTRITO INDUSTRIAL / BARRETOS / SP / 14783-033

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/04/2026 a 21/05/2026

Certificação Número: 2026042222306109664616

Informação obtida em 05/05/2026 11:32:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ANEXO II

Regularidade Trabalhista E Previdenciária

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.023.977/0001-13
Certidão nº: 45971284/2026
Expedição: 05/05/2026, às 11:33:34
Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.023.977/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANEXO III

Regularidade Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A
CNPJ: 49.023.977/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:08 do dia 05/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2026.
Código de controle da certidão: **5C5F.F6E0.D471.4522**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.023.977/0001-13

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26050212818-45
Data e hora da emissão	05/05/2026 11:35:29
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 14907/2026

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de BARRETOS, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **49.023.977/0001-13** (CNPJ)

Contribuinte: **IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A**

Endereço: **AV SEICHO NO IE 420**
DISTRITO INDUSTRIAL I

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de BARRETOS de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

BARRETOS (SP), 05 de maio de 2026.

Certidão emitida com base no(a) Decreto 11.638 de 27 de Fevereiro de 2023.

Certidão válida até 05/06/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço https://barretos.sp.gov.br.
Certidão emitida em 05/05/2026 as 11:30:48h. - Código de Validação **U7O4A2.J8J6R4.E3F8P9**
