BARRETOS INTELIGENTE

Barretos- SP, 09 de Agosto de 2026.

À

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barretos

A/C

Sr. Luís Carlos Diniz Buch

Secretário de Finanças

CMOG – COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO

REF.: Relatório Mensal de Julho e Notas Fiscais ,NF 66,NF 65, NF 67, NF 68 NF 69 – Parcela 4 1 e pagamento da parcela de Julho do BDE.

A IP Barretos Concessionária de Cidade Inteligente S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 49.023.977/0001-13, vem, por meio deste, encaminhar o Relatório Mensal referente ao mês de Julho/2026, bem como as respectivas Notas Fiscais, 66,65,67,68,69 de cobrança dos serviços prestados, correspondentes à Parcela 41, conforme discri- minado a seguir:

Nota Fiscal	Valor	Descrição
NF nº 65	R$ 481.911,43	Serviços de iluminação pública
NF nº 66	R$ 126.067,81	Serviços de videomonitoramento
NF nº 67	R$ 101.048,40	Parcela da Bonificação por Desempenho Energético (BDE), referente à competência de julho de 2026
NF nº 68	R$ 39.420,04	Primeira de três parcelas do valor retroativo decorrente do reajuste anual de 4,264380% pelo IPCA, referente aos serviços de iluminação pública
NF nº 69	R$ 10.312,26	Primeira de três parcelas do valor retroativo decorrente do reajuste anual de 4,264380% pelo IPCA, referente aos serviços de videomonitoramento
NF nº 71	R$ 6.228,87	Serviços de geração de energia fotovoltaica, referentes ao período de 12/07/2026 a 11/08/2026, correspondente ao percentual de 32,26%
Total	**R$ 764.989,81**	**Valor total das Notas Fiscais emitidas no período**

No que se refere à Nota Fiscal da Bonificação de Desempenho Energético (BDE), esclarece-se que sua apuração observou integralmente a metodologia validada pelo Verificador Independente e deliberada por este Comitê, mantendo-se os parâmetros técnicos já aprovados, com aplicação da tarifa unitária de energia elétrica (R$/kWh) e do percentual de eficiência energética apurado, sem inclusão de tributos, conforme detalhado no relatório técnico anexo.

Em consonância com o Relatório do Verificador Independente, encaminhado em 12 de janeiro de 2026, referete à aplicação do 4º semestre, as Notas Fiscais ora apresentadas foram emitidas com a aplicação do Fator de Desempenho Geral (FDG) igual a 1.

A partir deste período, as Notas Fiscais referentes às Usinas Solares Fotovoltaicas serão emitidas proporcionalmente ao percentual efetivamente implantado, entregue e em operação, conforme apuração demonstrada na planilha de rateio. À medida que novas usinas entrarem em funcionamento, o percentual e o valor faturado serão atualizados até atingir a parcela total de 32,26% da PRM prevista contratualmente.

Permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 07/08/2026 11:54:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE LTDA
MARCELA APARECIDA ALFINETE – GESTORA DO CONTRATO

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006626080000000009

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
66	05/08/2026	05/08/2026 09:15:10
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808540	3	05/08/2026 09:15:10
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço
Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 126.067,81	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 3.782,03

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 1.512,81	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 3.782,03	R$ 122.285,78	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 122,29
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 122,29	0,90%	0,90%	R$ 1.100,57

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 126.067,81	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 120.772,97	R$ 1.222,86	**R$ 120.772,97**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 3.782,03

Inf Cont: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE 12/07/26 A 11/08/26 (12,87% - PRM R$ 891.311,35) Parcela com reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. 1 - O Documento de Fatura, possui 1 via eletrônica enviada ao poder concedente e ao Banco Gestor da Conta Garantia, conforme estipulado no Contrato da Conta. 2 - O Fator do Marco da concessão está apresentado conforme item 7.2 do Anexo III do contrato de concessão. 3 - O Fator de desempenho geral está apresentado conforme item 4.2 do anexo III do contrato de concessão. 4 - Depósito: 001 - Banco do Brasil - Agência: 31-0 - Conta Corrente: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		66 / 35055001249023977000113000000000006626080000000009

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006526080000000005

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no porta nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
65	05/08/2026	05/08/2026 09:02:13
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808389	3	05/08/2026 09:02:13
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	14.01.01 - -	1.2001.35.00	Barretos / SP / -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Descrição do Serviço
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 481.911,43	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 14.457,34
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	**IRRF**	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**
	R$ 5.782,93	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	**CST / cClassTrib**	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF**	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 14.457,34	R$ 467.454,09	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 467,45
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 467,45	0,90%	0,90%	R$ 4.207,09
VALOR TOTAL DA NFS-e	**VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO**	**Desconto Incondicionado**	**Desconto Condicionado**
	R$ 481.911,43	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 461.671,16	R$ 4.674,54	**R$ 461.671,16**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 14.457,34

Inf Cont: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 12/07/26 A 11/08/26 (54,87% - PRM R$ 891.311,35) Parcela com reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. 1 - O Documento de Fatura, possui 1 via eletrônica enviada ao poder concedente e ao Banco Gestor da Conta Garantia, conforme estipulado no Contrato da Conta. 2 - O Fator do Marco da concessão está apresentado conforme item 7.2 do Anexo III do contrato de concessão. 3 - O Fator de desempenho geral está apresentado conforme item 4.2 do anexo III do contrato de concessão. 4 - Depósito: 001 - Banco do Brasil - Agência: 31-0 - Conta Corrente: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		65 / 35055001249023977000113000000000006526080000000005

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006726080000000002

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no porta nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
67	05/08/2026	05/08/2026 09:18:56
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808585	3	05/08/2026 09:18:56
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço
Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 101.048,40	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 3.031,45

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 1.212,58	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 3.031,45	R$ 98.016,95	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 98,02
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 98,02	0,90%	0,90%	R$ 882,15

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 101.048,40	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 96.804,37	R$ 980,17	**R$ 96.804,37**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 3.031,45

Inf Cont: Bonificação de Desempenho Energético (BDE) - (mensal) conforme Contrato de Concessão Administrativa e Parecer CMOG. CONTA PARA DEPÓSITO: 001 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 31-0 CONTA CORRENTE: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 00000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		67 / 35055001249023977000113000000000006726080000000002

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006826080000000006

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
68	05/08/2026	05/08/2026 09:27:10
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808669	3	05/08/2026 09:27:10
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço
Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 39.420,04	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 1.182,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 473,04	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 1.182,60	R$ 38.237,44	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 38,24
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 38,24	0,90%	0,90%	R$ 344,14

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 39.420,04	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 37.764,40	R$ 382,38	**R$ 37.764,40**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 1.182,60

Inf Cont: Iluminação: R$ 39.420,04 Referente à 1ª parcela de 3 do retroativo do reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, correspondente às competências de janeiro e fevereiro de 2026, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 0000000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		68 / 35055001249023977000113000000000006826080000000006

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006926080000000000

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
69	05/08/2026	05/08/2026 09:30:08
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808691	3	05/08/2026 09:30:08
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço

Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 10.312,26	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 309,37
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	**IRRF**	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**
	R$ 123,74	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	**CST / cClassTrib**	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF**	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 309,37	R$ 10.002,89	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 10,00
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 10,00	0,90%	0,90%	R$ 90,03
VALOR TOTAL DA NFS-e	**VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO**	**Desconto Incondicionado**	**Desconto Condicionado**
	R$ 10.312,26	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 9.879,15	R$ 100,03	**R$ 9.879,15**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 309,37

Inf Cont: Telecomunicações: R$ 10.312,26 Referente à 1ª parcela de 3 do retroativo do reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, correspondente às competências de janeiro e fevereiro de 2026, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 000000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		69 / 35055001249023977000113000000000006926080000000000

RELATÓRIO MENSAL
JULHO/2026



BARRETOS
INTELIGENTE

GESTÃO POR MEIO DE PPP

BARRETOS
PREFEITURA

BARRETOS
INTELIGENTE

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO MENSAL

REFERENTE A

Julho/2026

Objeto: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E USINA FOTOVOLTAICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

Data de assinatura: 11 de janeiro de 2023.
Município Atendido: Barretos/SP
Parque de Iluminação Pública: 23.615 pontos
Iluminação de Destaque: 528 equipamentos
Infraestrutura de Fibra Óptica: 80,7 km | 165 pontos na zona urbana
Infraestrutura de Rádio: raio de 31,3 km | 18 pontos na zona rural
Videomonitoramento: 84 câmeras em 40 pontos de monitoramento
WiFi público: 28 pontos | 10 usuários com no mínimo 5 Mbps ao mesmo tempo
Geração de Energia: 5.855.970,04 kWh/ano | atender 319 unidades consumidoras

Consórcio IP Barretos
Av. Seicho No Ie, 420, Distrito Industrial, Barretos/SP, CEP: 14.783-033

BARRETOS INTELIGENTE

Barretos, 03 de Agosto 2026

À

PREFEITRUA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

CMOG – COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO

VERIFICADOR INDEPENDENTE – ERNST & YOUNG

Este Relatório visa apresentar as atividades dos compromissos acordados no CONTRATO DE CONCESSÃO nº 14-2023, referente aos SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E USINA FOTOVOLTAICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

Estamos à disposição para quaisquer modificações e/ou correções que se fizerem necessárias.

Responsáveis Técnicos:

Engº EDSON JOSE LOPES DAS NEVES

Engº FABRICIO MOREIRA MELLO RIBEIRO

Engº PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARAES

Engº PEDRO CICCI CUNHA CASTRO

Engº REGIS HONORIO

Engº JULIO JOSÉ ALVARES LOPES DAS NEVES

A IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A, responsável pela execução dos SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP, através de CONTRATO DE CONCESSÃO Administrativa nº 14-2023 na modalidade PPP (Parceria Público Privada) apresenta ao COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO - CMOG e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE relatório das suas atividades técnicas, realizadas no período de 01/07/2026 a 31/07/2026.

1. REGULARIDADES CONTRATUAL

1.1 Regularidade FGTS – ANEXO I

1.2 Regularidade Trabalhista e Previdenciária – ANEXO II

1.3 Regularidade Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal – ANEXO III

1.4 Garantia de Execução do Contrato – ANEXO IV

1.5 Relatório de Segurança


2. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1. Evolução Mensal da Taxa de Falha por região da cidade (norte, sul, leste, oeste, centro), desde julho/2023 - (ideal < 4%).

Regiões	Total de Pontos Cadastrados	Quantidade de Chamados/Atendimentos
Norte	4934	3473
Sul	7392	5661
Leste	5636	3568
Oeste	3020	2908
Centro	2614	1345
Total	23596	16955

BARRETOS INTELIGENTE

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS						
Mês	**Norte**	**Sul**	**Leste**	**Oeste**	**Centro**	**Total**
Julho	391	450	185	291	85	1402
Agosto	388	417	260	263	241	1569
Setembro	305	319	275	193	107	1199
Outubro	208	452	304	233	80	1277
Novembro	216	360	185	220	76	1057
Dezembro	241	325	142	160	90	958
Janeiro	227	241	182	157	70	877
Fevereiro	140	216	115	152	61	684
Março	143	237	201	101	42	724
Abril	173	314	151	146	48	832
Maio	169	189	101	93	33	585
Junho	106	198	70	58	17	449
Julho	41	171	65	36	8	321
Agosto	37	94	37	33	19	220
Setembro	32	100	52	19	5	208
Outubro	36	78	53	38	21	226
Novembro	49	124	32	39	29	273
Dezembro	24	85	36	51	16	212
Janeiro	39	93	145	50	13	340
Fevereiro	30	52	70	51	16	219
Março	44	83	72	42	45	286
Abril	41	121	71	65	44	342
Maio	84	99	92	36	21	332
Junho	31	57	60	24	9	181
Julho	38	88	53	68	9	256
Agosto	17	50	39	19	13	138
Setembro	17	80	45	24	27	193
Outubro	20	42	37	26	22	147
Novembro	15	33	63	22	3	136
Dezembro	6	25	38	16	2	87
Janeiro	22	51	34	21	15	143
Fevereiro	26	136	72	40	12	286
Março	19	68	68	16	9	180
Abril	31	74	40	28	13	186
Maio	30	40	33	34	10	147
Junho	14	36	37	13	6	106
Julho	23	63	53	30	8	177

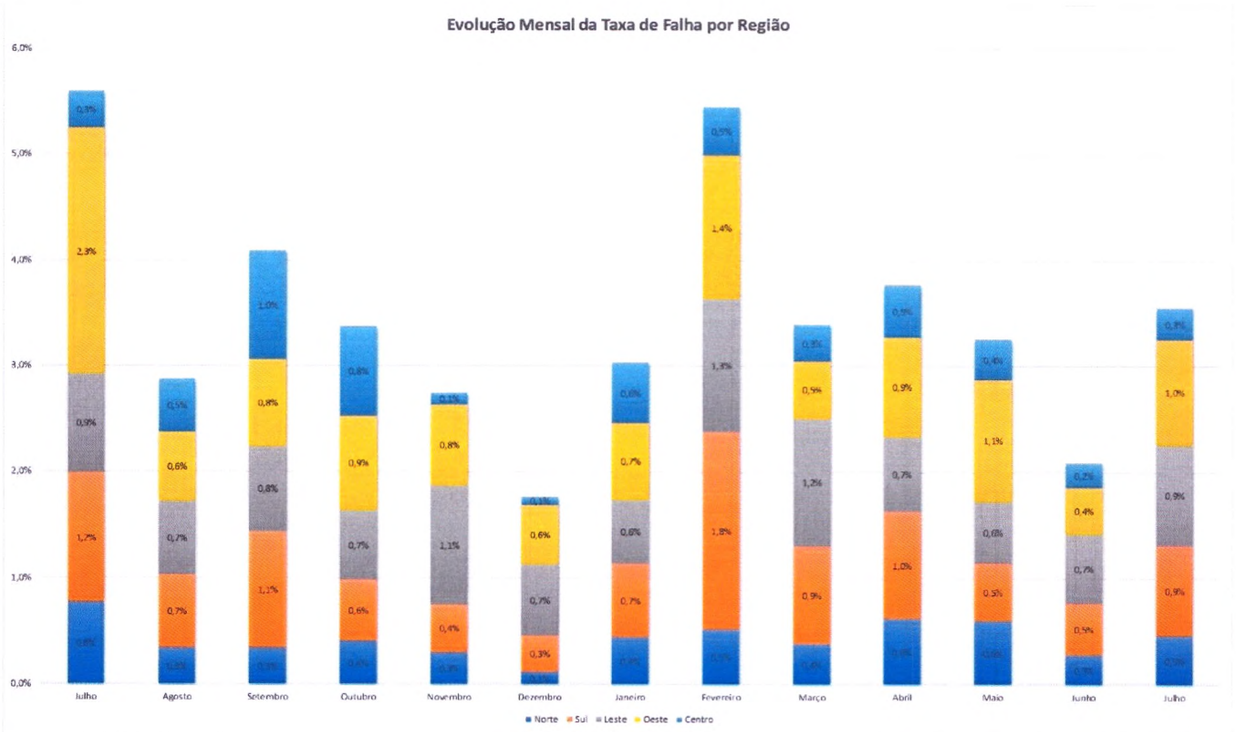


2.2. Evolução Mensal do número de chamados resolvidos por canal:

i. Call-Center 0800


ii. Aplicativo

iii. Site

iv. Ronda e Avulsos

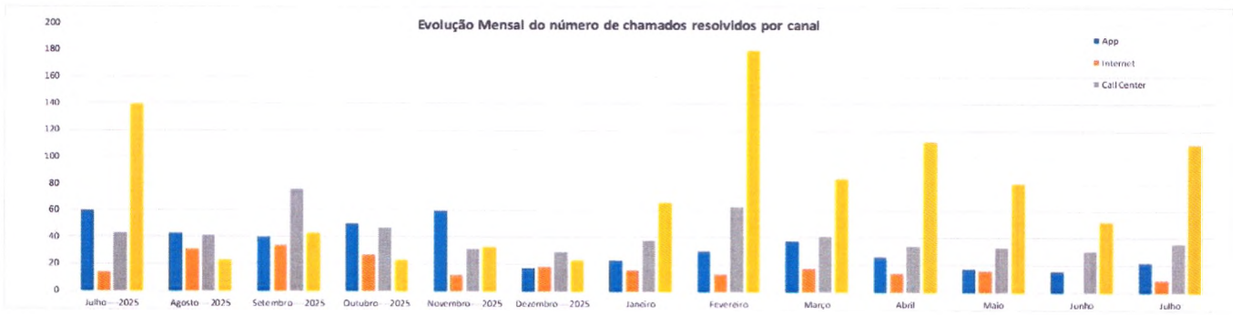

2.3. Evolução Mensal do Tempo Médio de Atendimento

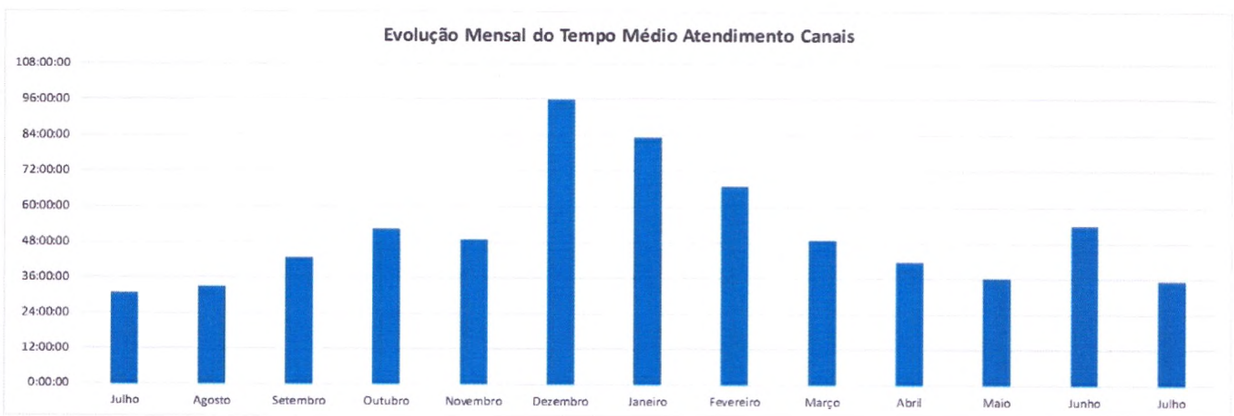

Prazo contratual: 168 horas.

3. IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED – 23.615 UNIDADES

a. Informação sobre o Projeto Executivo – Aprovação e dificuldades encontradas

Os projetos executivos da modernização do parque de IP foram concluídos e feitos com base na classificação das Vias informada no Termo de Referência do processo licitatório. A classificação das vias varia de V1 a V5 conforme a NBR5101/2018, sendo V1 classificada como as vias principais de grande fluxo de carros e V5 classificadas como vias locais de bairros com pouco fluxo de carros. Foram seguidas as classificações informadas no Projeto Básico do Edital, porém notamos que houve necessidade de reclassificações que informamos em 1º Ofício enviado ao CMOG em 12/03/24 e em 2º Ofício enviado ao CMOG em 11/07/24. Em 20/06/24, em resposta ao Ofício 040/24 do CMOG de 01/06/24, encaminhamos novas considerações a respeito das classificações das vias. Ao final dos projetos foram reclassificados 4.882 pontos de iluminação em diversas Ruas e Avenidas da cidade. Vamos elaborar os estudos para avaliar o impacto financeiro destas reclassificações.

Esclarecendo: por exemplo, Bairros inteiros como o San Diego, São Francisco, Jardim Califórnia, Jardim Anastácio e outros, onde a classificação de Via está como V5 no Edital, no local temos luminárias instaladas de 250W típicas de vias V2, assim, projetamos como V2 colocando luminárias de LED de 70W mantendo o equilíbrio de luminosidade, e ainda com economia de 75% do consumo de energia. Ao contrário, se projetarmos como V5 como está no Termo de Referência, colocaríamos luminárias LED de 30W, atenderia a Norma 5101, mas diminuiria em muito a iluminância média o que causaria insatisfação muito grande dos munícipes que já estão habituados com uma luminosidade melhor. **Região central, outro exemplo, teríamos a maioria como V5 e foram reclassificadas para V2.** Não são casos isolados e sim bairros inteiros. Há muitos outros bairros na mesma situação.

As reclassificações de Vias demandam luminárias de maior potência do que as originalmente previstas no Edital e, portanto, serão objeto de Reequilíbrio Econômico-Financeiro – REF. Para além do investimento maior em luminárias, também haverá maior consumo de energia,

consequentemente a apuração da Bonificação de Desempenho Energético (BDE) também será menor havendo necessidade de recomposição.

REF é um procedimento muito comum em projetos modelo PPP. Chegamos ao final da modernização das vias e não ocorreram novas reclassificações.

No quadro abaixo temos as potências das luminárias que foram entregues pelo fabricante até 28/11/24 atendendo à demanda de projetos. Devido à não reclassificação de novas vias, e seguindo os projetos originais do Edital, onde temos grande quantidade de Vias V5, destaca-se a luminária de 30W:

luminárias entregues até 28/novembro/24										
pot (W)	lote 1	lote 2	lote 3	lote 4	lote 5	lote 6	lote 7	lote 8	lote 9	TOTAL
30W	1010	1767		500	1500	500		656	26	5959
40W		505							4	509
50W		505		200	500	800	1000		20	3025
60W		505							1	506
70W	1010	1155	2000	1500	200				279	6144
80W	1010									1010
90W		252		800	400		150	362	164	2128
110W		121								121
120W		232		600	500		350	911	163	2756
TOTAL	3030	5042	2000	3600	3100	1300	1500	1929	657	**22158**

Em 28/11/25 recebemos o ÚLTIMO lote (9) destinado a modernizações de praças, futuras expansões e manutenções.

Foram encaminhadas à CPFL até 31/maio, 71 lotes de substituições feitas para a atualização do cadastro e contas de consumo. **Estamos aguardando a finalização das atualizações e o impacto nas novas contas de consumo. Até 31 de maio/25 as contas da CPFL apresentavam redução de consumo de 60,95% - Anexo VI.**

b. Quantitativo implantado (Cronograma x Realizado)

Resumo do realizado nas substituições para modernização com LED até 31/julho:

resumo modernização até Julho/26	
Total de Pontos Luminosos EDITAL	23.615
Total de Pontos Modernizados:	23732
Redução de Pontos	2418
Pontos instalados LED	21314
Percentual Modernizado no período:	100,50%
Percentual Redução de Carga:	76,00%
Carga anterior (kWatt)	5697,74
Carga instalada (kWatt)	1367,618

Notar que a eficientização do parque de IP, além da redução do consumo de energia e outros benefícios da tecnologia LED, promoveu uma redução de 2.419 luminárias.

Do total de luminárias retiradas do parque de IP (23.714), temos:

- Vapor de sódio e Vapor metálico: 22.120 – LED: 1.594

Destacamos que já ultrapassamos a quantidade de luminárias modernizadas estipuladas no Edital, superando em 99 luminárias, ou seja, 100,42%.

Temos ainda alguns casos de luminárias que não foram modernizadas que se concentram em praças e rotatórias. As chuvas também impossibilitam a entrada dos caminhões nas praças pois danificam os gramados. Outros impedimentos como presença de abelhas nos postes/estruturas, próximos de rede primária (alta tensão) e necessidade de poda de árvores.

Vias Públicas do município já estão ***100% modernizadas***.

A Concessionária encaminhou regularmente os relatórios e documentos necessários à aferição dos indicadores. Contudo, considerando que ainda não foi realizada nova extração neste mês, em razão da ausência de agendamento pelo Verificador, a avaliação dos indicadores técnicos será efetuada com base nos dados operacionais e no relatório de gravação de imagens extraídos em 13/07/2026.

Os indicadores objetivos de desempenho da rede apresentaram conformidade no período, destacando-se o Indicador de Velocidade Média de Conexão (IVC), que registrou **0% de não conformidade**, conforme aferições realizadas no ciclo vigente, em linha com o padrão de desempenho esperado para o sistema.

No que se refere ao Indicador de Satisfação do Serviço RD (ISS-RD), a nota atribuída decorre de uma pesquisa com apenas 7 respostas, das quais 4 foram classificadas como "Bom", resultando em 57,14% de avaliação positiva.

Nesse contexto, entende-se que a pontuação atribuída não reflete de forma representativa o desempenho efetivo do serviço no período, considerando a amostragem extremamente reduzida e a ausência de detalhamento da metodologia utilizada para aplicação da pesquisa, incluindo critérios de seleção, abrangência e forma de coleta dos dados.

Adicionalmente, a análise técnica das ordens de serviço evidencia que os registros operacionais contemplam ocorrências de naturezas distintas, incluindo situações não relacionadas diretamente à qualidade da rede, o que reforça a necessidade de avaliação integrada dos indicadores e da correta classificação das ocorrências.

Diante do exposto, a Concessionária apresenta contestação quanto à nota atribuída ao ISS-RD, por entender que os critérios adotados não asseguram representatividade estatística nem aderência às boas práticas de avaliação de desempenho.

Reitera-se, por fim, o compromisso da Concessionária com a transparência, a qualidade dos serviços prestados e a melhoria contínua dos processos operacionais, permanecendo à disposição para esclarecimentos adicionais e para análise técnica conjunta dos dados apresentados.

4. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO (BDE) e Índice de Eficientização (IE)

A Bonificação de Desempenho Energético (BDE) vem sendo apurada conforme os critérios contratuais estabelecidos, considerando a economia de energia efetivamente comprovada no período avaliado. O valor do bônus tem sido calculado com base na diferença entre o consumo inicial de referência e o consumo eficientizado após a modernização do parque de iluminação, refletindo o desempenho alcançado pela Concessionária na redução do consumo energético.

Premissas e Metodologia de Cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE)

a. Base conceitual do cálculo

O cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE) fundamenta-se na comparação entre o **Consumo Específico Original (CE_0)** e o **Consumo Específico Efetivo (CE_ef)** do parque de iluminação pública, após a implantação das ações de eficientização energética.

b. Índice de eficiência energética (EE)

A eficiência energética é apurada por meio da seguinte relação:

- $EE = 1 - (CE_ef / CE_0) \times t \times 100\%$

  Onde *t* representa o fator de ajuste proporcional à variação da potência instalada (ip_t / ip_0).

c. Cálculo do consumo específico médio

O consumo específico médio considera a relação entre consumo de energia e potência instalada:

- $CE_{m0} = CE_0 / ip_0$
- $CE_{me}f = CE_ef / ip_t$

d. Apuração do percentual de eficiência alcançado

Aplicando os valores apurados no período de referência, foi identificado um **percentual de eficiência energética de 76,29%**, superando a meta mínima contratual.

e. Cálculo da energia efetivamente economizada

A energia economizada (kWh) é calculada pela diferença entre o consumo original e o consumo efetivo, multiplicada pelos dias do mês e pelo tempo médio de operação:

- Energia Economizada (kWh) = $(CE_0 - CE_ef) \times nº \text{ de dias} \times T_{mi}$

Premissas e Metodologia de Cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE)

Base conceitual do cálculo

O cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE) fundamenta-se na comparação entre o Consumo Específico Original (CE_0) e o Consumo Específico Efetivo (CE_ef) do parque de iluminação pública, após a implantação das ações de eficientização energética.

Índice de eficiência energética (EE)

A eficiência energética é apurada por meio da seguinte relação:

$EE = 1 - (CE_ef / CE_0) \times t \times 100\%$

Onde t representa o fator de ajuste proporcional à variação da potência instalada (ip_i / ip_0).

Cálculo do consumo específico médio

O consumo específico médio considera a relação entre consumo de energia e potência instalada:

$CE_{m0} = CE_0 / ip_0$

$CE_{me}f = CE_ef / ip_t$

Apuração do percentual de eficiência alcançado

Aplicando os valores apurados no período de referência, foi identificado um percentual de eficiência energética de 76,29%, superando a meta mínima contratual.

Cálculo da energia efetivamente economizada

A energia economizada (kWh) é calculada pela diferença entre o consumo original e o consumo efetivo, multiplicada pelos dias do mês e pelo tempo médio de operação:

Energia Economizada (kWh) = $(CE_0 - CE_ef) \times$ nº de dias $\times T_{mi}$

Definição da meta de economia contratual

A meta de economia corresponde a 60% do consumo original, conforme previsto contratualmente:

Meta de Economia (kWh) = $CE_0 \times 60\% \times$ nº de dias $\times T_{mi}$

Cálculo do excedente de economia

O excedente passível de bonificação corresponde à diferença positiva entre a energia economizada e a meta contratual:

Excedente = Energia Economizada − Meta de Economia

Cálculo do valor financeiro da bonificação

O valor do repasse financeiro é obtido pela aplicação do percentual de excedente sobre a tarifa média do período:

Valor do Repasse (R$) = Excedente × % Excedente × Tarifa média mensal

Parâmetros tarifários e temporais

Foram considerados:

Tarifa média mensal aplicável ao período;

Quantidade de dias de cada mês;

Tempo médio diário de funcionamento do parque de iluminação.


Validação técnica

As premissas, fórmulas e resultados do cálculo foram avaliados e validados pelo Verificador Independente, servindo de base para a deliberação administrativa do CMOG.

Para o período avaliado, foram considerados os seguintes critérios:

- **Mês avaliado:** Abril
- **Quantidade de dias:** conforme mês civil
- **Tarifa de energia elétrica:** composta pelos componentes tarifários **TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição)** e **TE (Tarifa de Energia)**, conforme faturas da concessionária de energia elétrica, **sem inclusão de tributos**, encargos ou retenções fiscais;
- **Tarifa de energia com tributos:** utilizada apenas para fins informativos, não integrando a base de cálculo da bonificação;
- **Valor Inicial (kWh):** correspondente ao consumo de referência do parque de iluminação pública;

- **Valor Eficientizado (kWh):** correspondente ao consumo efetivo após a implantação das medidas de eficiência energética;
- **Valor Economizado (kWh):** diferença apurada entre o consumo de referência e o consumo eficientizado;
- **Meta de Economia:** fixada contratualmente em **60%** do consumo de referência;
- **Percentual de eficiência energética (EE):** mantido em **76,29%**, uma vez que não houve alteração na potência instalada (kW) nem nos parâmetros operacionais do parque.

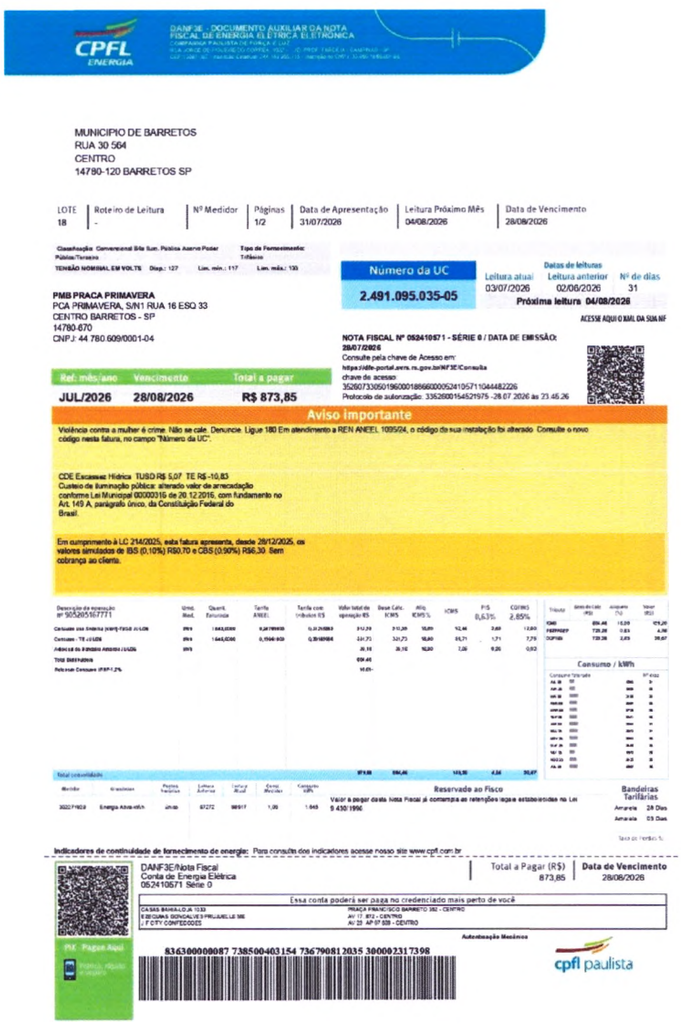

CPFL ENERGIA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE BARRETOS
RUA 30 564
CENTRO
14780-120 BARRETOS SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	-		1/2	31/07/2026	04/08/2026	28/08/2026

Classificação: Comercial Sfe Sun. Pública Asseio Poder Público/Terceiro — Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS — Disp.: 127 — Lim. min.: 117 — Lim. máx.: 133

PMB PRAÇA PRIMAVERA
PCA PRIMAVERA, S/N1 RUA 16 ESQ 33
CENTRO BARRETOS - SP
14780-670
CNPJ: 44.780.609/0001-04

Número da UC: 2.491.095.035-05

Datas de leituras — Leitura atual: 03/07/2026 — Leitura anterior: 02/06/2026 — Nº de dias: 31
Próxima leitura 04/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 052410571 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 28/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso
35260733050196000188660000524105711044482226
Protocolo de autorização: 335260015452197S - 28.07.2026 às 23:46:26

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	28/08/2026	R$ 873,85

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180 Em atendimento a REN ANEEL 1009/04, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 5,07 TE R$ -10,83
Custeio de iluminação pública: alterado valor da arrecadação conforme Lei Municipal 02000316 de 20.12.2016, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,70 e CBS (0,90%) R$6,30. Sem cobrança ao cliente.

Consumo / kWh

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996

Bandeiras Tarifárias
Amarela 28 Dias
Amarela 03 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consultar os indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052410571 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
873,85	28/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você
CASAS BAHIA LO. N. 1133 — PRAÇA FRANCISCO BARRETO 382 - CENTRO
E SEQUINS GONÇALVES PRUDENTE ME — AV. 17 - 872 - CENTRO
J F CITY CONFECCIONES — AV. 25 - AP 07 559 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

836300000087 738500403154 736790812035 300002317398

cpfl paulista

Consórcio IP Barretos

Av. Seicho No Ie, 420, Distrito Industrial, Barretos/SP, CEP: 14.783-033

Mês avaliado	#dias	Tarifa de Energia - TUSD	Tarifa de Energia - TE	Tarifa de Energia (com tributos)	Valor Inicial (KWH)	Valor Eficientizado (KWh)	Valor Economizado	Meta de Economia	Bonificação de Desempenho Energético
mar/25	31	0,26261905	0,23	0,49261905	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	96873,72
abr/25	30	0,26255814	0,23023256	0,4927907	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	93781,42
mai/25	31	0,26596492	0,22491229	0,49087721	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	96531,18
jun/25	30	0,27791667	0,20583334	0,48375001	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	92060,92
jul/25	31	0,27468086	0,20340426	0,47808512	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	94015,61
ago/25	31	0,27206897	0,20137932	0,47344829	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	93103,78
set/25	30	0,27955556	0,20688889	0,48644445	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	92573,69
out/25									
nov/25									
dez/25	31	0,27805346	0,20587003	0,48392349	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	95163,73
jan/26	31	0,27695168	0,20505577	0,48200745	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	94786,94
fev/26	28	0,2566309	0,20505577	0,46168867	1817330,077	430899,224	R$ 1.386.430,85	R$ 1.090.398,05	82004,64
mar/26	31	0,27456411	0,20328206	0,47784617	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	93968,62
abr/26	30	0,27767155	0,20558597	0,48325752	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	91967,19
mai/26	31	0,28919033	0,20410323	0,49329356	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	97006,36
jun/26	30	0,31685422	0,2046752	0,52152942	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	99250,60
jun/26	31	0,31218845	0,20185958	0,51384803	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	101048,40
jul/26				0	0	0	R$ -	R$ -	0,00

5. Receita Acessória – 4º Aditamento Contratual

Os valores mensais referentes aos links de internet estão sendo recebidos regularmente, permanecendo pendente apenas o pagamento dos valores retroativos. O tema foi tratado nas reuniões mensais realizadas em junho de 2026, nas quais ficou acordado que os valores retroativos serão contemplados em futuro processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme os mecanismos contratuais aplicáveis.

6. Usinas Fotovoltaicas

No que se refere às Usinas Fotovoltaicas, informa-se que as unidades instaladas no Centro de Reabilitação e no SAMU permanecem em plena operação e em fase de geração de energia.

Adicionalmente, a CPFL autorizou a implantação das usinas fotovoltaicas nos seguintes locais:

- PMB – EM João Baroni;
- PM Barretos – CEMEI Jardim dos Coqueiros;
- EM Fausto Lex;
- PMB – CEMEI Cleuza Pereira Barreto;
- CEMEI Izadora Bevilacqua de Souza Merenda;
- CEMEI José Sebastião Domingos – CEMEI Vida Nova;

- PMB – CEMEI Tem Afonso Câmara Filho;
- CEMEI Elza Maria Pitta Bezerra – CEMEI Santa Cecília;
- EM Sagrados Corações;
- PMB – Parque Infantil;
- CEMEI Luzia Costa Fernandes – CEMEI Califórnia;
- PMB – EM Anália Franco;
- PMB – EM Prof. Dorotóvio Nascimento;
- PMB – EMEI Ana Carvalho Castanho;
- CEMEI Anna Kerulis da Silveira;
- PMB – Unidade Integrada Pimenta; e
- PMB – EM Prof. Giuseppe Carnimeo.

Com a liberação dos novos pontos pela CPFL, a Concessionária encontra-se elaborando o cronograma de execução, que deverá ser concluído e apresentado no início da próxima semana, contemplando o planejamento para o início das obras de implantação das novas unidades.

A Concessionária permanece à disposição para dar prosseguimento às providências necessárias e informará a evolução das obras conforme as etapas previstas no cronograma.

PMB EM JOAO BARONI
PM BARRETOS CEMEI JARDIM DOS COQUEIROS
EM FAUSTO LEX
PMB CEMEI CLEUZA PEREIRA BARRETO
CEMEI IZADORA BEVILACQUA DE SOUZA MERENDA
CEMEI JOSE SEBASTIAO DOMINGOS - CEMEI VIDA NOVA
PMB CEMEI TEM AFONSO CAMARA FILHO
CEMEI ELZA MARIA PITTA BEZERRA (CEMEI SANTA CECILIA)
EM SAGRADOS CORAÇÕES
PMB PARQUE INFANTIL
CEMEI LUZIA COSTA FERNANDES (CEMEI CALIFORNIA)
PMB EM ANALIA FRANCO
PMB PARQUE INFANTIL
PMB EM PROF DOROTOVIO NASCIMENTO
PMB EMEI ANA CARVALHO CASTANHO
CEMEI ANNA KERULIS DA SILVEIRA
PMB UNIDADE INTEGRADA PIMENTA
PMB EM PROF GIUSEPPE CANIMEO

Consórcio IP Barretos
Av. Seicho No Ie, 420, Distrito Industrial, Barretos/SP, CEP: 14.783-033

Para ciência, o Termo de Referência, Anexo I do Contrato de Concessão, prevê o seguinte:

6 DA(S) USINA(S) FOTOVOLTAICA(S) DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (UFV)

6.1 Neste capítulo é apresentado o escopo do projeto de implantação, operação e manutenção de uma UFV de geração distribuída que deverá ser implantada em local do PODER CONCEDENTE, para suprir parcialmente a demanda energética das edificações públicas mun icipa is . A projeção total de geração de energia elétrica da UFV de geração distribuída é de no mínimo 5 . 855 . 970 , 04 kWh (cinco milh ões, oitocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta inteiros e quatro centés imos).

6.2 A CONCESSIONÁRIA poderá selecionar outro local para instalação da UFV, mediante aprovação do PODER CONCEDENTE, desde que as inf or mações do Par ecer de Acesso emitido pela distr ibuidor a local indiquem a inviabilidade do local selecionado.

6.1.2. Memorial Descritivo

.....

A UFV poderá ser instalada em solo ou em telhados através de estruturas metálicas, com inclinação em relação ao horizonte e desvio do Norte

Geogr áfico a serem definidos. Ela é composta por módulos solares ligados em série/paralelo .....

Lembramos que o CMOG, em seu Relatório de Desempenho da Concessionária encaminhado em 24/10/24, cita em seu item 5:

O Poder Concedente autoriza os estudos a fim de que as placas fotovoltaicas sejam nos telhados dos prédios públicos.

O Poder Concedente pediu parecer ao Verificador Independente em 6/março/25 sobre as instalações de placas fotovoltaicas em telhados, cuja resposta foi enviada em 17/março/25.

7 Telegestão

A instalação do sistema de telegestão foi concluída em aproximadamente 21 mil pontos devido a retirada de praças que entra em conflito com as contatoras que matem os refletores ligados no período ajustado, encontrando-se em pleno funcionamento, com aplicação de dimerização. Ficou alinhado que a Prefeitura poderá indicar locais e horários específicos para otimização do consumo energético.

8 Pontos de Wi-Fi

Informa-se que todos os pontos de Wi-Fi previstos contratualmente se encontram em pleno funcionamento, atendendo regularmente às condições e aos parâmetros estabelecidos no contrato. As ocorrências anteriormente identificadas foram solucionadas há tempo, não havendo, no período atual, registro de pontos inoperantes ou de pendências relacionadas à prestação do serviço.

A Concessionária realiza testes operacionais e as validações necessárias, de modo a assegurar a normalização e a estabilidade do sistema após a conclusão das instalações, conforme evidenciado nos registros anexos.

9 Expansão do Parque de Iluminação

O Contrato de Concessão estabelece meta anual de expansão de 219 pontos. No exercício de 2025, essa meta foi superada, totalizando 279 novos pontos instalados.

O quantitativo excedente de 60 unidades ultrapassa a meta contratual originalmente prevista para o período. Conforme alinhamento realizado com o Poder Concedente, esse excedente foi **reprogramado para o exercício de 2026**, passando a compor a meta física do referido ano.

Dessa forma, o exercício de 2026 foi iniciado já com a **incorporação dos pontos excedentes provenientes de 2025**, conforme demonstrado na tabela a seguir, refletindo a antecipação de metas e a continuidade do plano de expansão.

Ressalta-se que essa reprogramação não configura ampliação contratual imediata, mas sim a **realocação de metas previamente executadas**, com posterior formalização por meio dos instrumentos administrativos cabíveis, assegurando a adequada compatibilização do cronograma físico-financeiro da concessão.

Novas demandas de expansão permanecem sujeitas à análise técnica e deliberação da Secretaria de Obras, observando os critérios de priorização e planejamento municipal.

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA - Atendimento a Expansões															
previso/realizado	2025	2025												%	Qtde.
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
PREVISTO EXPANSÕES	219	219 - crescimento anual												100%	219
REALIZADO	287	95	27	17	0	0	6	0	23	111	0	8	0	131,1%	287

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA - Atendimento a Expansões															
previso/realizado	2026	2026												%	Qtde.
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
PREVISTO EXPANSÕES	219	219 - crescimento anual												100%	219
REALIZADO	120	38	17	27	10	12	3	13						54,8%	120

Acompanhamento das Expansões – Exercício 2026

Conforme cronograma de referência para atendimento às expansões previsto para o exercício de 2026, a meta anual estabelecida corresponde a 219 pontos.

Diante deste cenário, destaca-se que, uma vez atingido o quantitativo anual pactuado, qualquer nova solicitação de expansão ou instalação de pontos adicionais fora do volume originalmente previsto deverá ser tratada como atendimento excedente ao escopo base contratado.

Assim, os pontos implantados além da meta anual deverão ser objeto de apuração individualizada e correspondente cobrança por ponto adicional executado, considerando os custos de materiais, mão de obra, mobilização, equipamentos e demais impactos operacionais, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

9.a Qualitativo implantado – Indicadores de Iluminação Pública

No mes de fevereiro foram feitas as aferições referentes às modernizações realizadas no trimestre.

Total de aferições: 315
Com a presença do VI: 50
Somente Concessionária: 265

b. Demanda Reprimida da Iluminação Pública

Não foram realizadas demandas reprimidas

c. Descarte de lâmpadas

No mês de julho não tivemos descarte de materiais.

O Relatório de Modernização que extraímos de nosso Sistema e encaminhado mensalmente ao Verificador Independente e ao Poder Concedente apresenta resumidamente para o período de **janeiro/2024 a julho 2026** o seguinte quadro ao qual estamos contabilizando:

resumo modernização até Julho/26	
Total de Pontos Luminosos EDITAL	23.615
Total de Pontos Modernizados:	23732
Redução de Pontos	2418
Pontos instalados LED	21314
Percentual Modernizado no período:	100,50%
Percentual Redução de Carga:	76,00%
Carga anterior (kWatt)	5697,74
Carga instalada (kWatt)	1367,618

10 IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – 36 locais e 535 pontos

Em decorrência das inviabilidades técnicas e operacionais identificadas em parte dos pontos de destaque originalmente previstos, foi acordada, junto ao Poder Concedente, a substituição desses pontos pela implantação de novos pontos de iluminação nos entornos dos lagos do município, assegurando o cumprimento das metas contratuais e a equivalência técnica das intervenções.

As obras tiveram início no final do mês de dezembro, encontrando-se, até a presente data, em fase avançada de execução, com frentes de serviço já implantadas e em operação parcial.

Ressalta-se que a execução dos serviços segue o cronograma ajustado, sendo que, no próximo mês, será apresentada tabela comparativa contendo o detalhamento dos pontos executados, substituídos e remanescentes, de forma a permitir o acompanhamento técnico e administrativo da evolução do escopo.

Destaca-se, por fim, que tais adequações não impactam os critérios de cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE), permanecendo válidos os parâmetros técnicos e metodológicos já aprovados.

Com relação ao quantitativo executado, registra-se que, do total de **536 pontos considerados no escopo atualizado**, **424 já foram executados**, incluindo **52 pontos implantados nos entornos dos lagos**, os quais substituíram pontos originalmente previstos. Restam, portanto, **112 pontos para a conclusão integral do escopo**.

Esclarece-se que, em comunicação anterior, foi informado quantitativo divergente em função de atualização de base de dados ainda em consolidação à época. Pedimos desculpas pelo desencontro de informação e reforçamos que os dados ora apresentados refletem a posição atualizada e validada.

Os pontos remanescentes correspondem, majoritariamente, a locais onde não foi possível realizar a implantação, em razão de ausência de autorização, intervenções em andamento, inexistência de infraestrutura elétrica próxima ou inviabilidade técnica.

11 IMPLANTAÇÃO DA INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – 115 PRÉDIOS

Concluímos 148 links de internet (alguns prédios estão com backup) superando em 28,69% o previsto de 115 conexões, o que será motivo de reequilíbrio econômico-financeiro-REF.

12 IMPLANTAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO – 84 CÂMERAS

As instalações e as conexões das 84 câmeras ao CCO de Segurança da Prefeitura em 41 pontos distintos na cidade foram concluídas.

As pendências de gravação de 30 dias de armazenamento de imagens foram solucionadas e temos pleno cumprimento do contrato.

13- Monitoramento Rural

No âmbito do projeto de monitoramento rural do município, informa-se que a implantação teve início na região da Cachoeirinha (Capela São Sebastião), ponto 42, com a instalação da infraestrutura necessária à operação do sistema e a ativação de duas câmeras LPR, em operação desde 04/03/2026 e 19/03/2026.

Na sequência do cronograma, foram realizados avanços no Distrito de Alberto Moreira, com a implantação de pontos de monitoramento em dois locais — Avenida 5 com Rua 10 (acesso aos ranchos), ponto 43, e Silo da Coopercitrus, na Rodovia Vicinal Nadir Kenan, ponto 44 —, ambos em operação desde 06/04/2026. Posteriormente, foi implantado o ponto 45, em Contendas (estrada de saída para Pau Impé), em operação desde 20/04/2026.

A etapa seguinte contemplou a região de Ibitu, com a implantação de dois pontos de monitoramento — entrada de Contendas, na Avenida Jorge Tibiriçá, ponto 46, e Vicinal Três Barras, ponto 47 —, ambos em operação desde 09/05/2026.

Atualmente, as frentes de serviço encontram-se direcionadas às localidades de Brejinho (cruzamento), ponto 48, e Adolfo Pinto (igreja), onde já foi concluída a implantação dos postes em 15/04/2026, seguindo-se as etapas de ativação. Na sequência do cronograma estão previstas as localidades de Prata, Água Limpa, Três Barras, Lagoinha, Palmar, Pau Impé e Estrada de Guaíra, com o objetivo de ampliar a cobertura de segurança e apoiar as ações de vigilância no município.

14 CAMERAS FACIAIS

Em atendimento ao Ofício nº 121/2026 – SMOP, de 8 de maio de 2026, a Concessionária informa que se encontra em andamento o projeto de implantação de câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial.

O projeto compreende o levantamento técnico dos locais indicados, a implantação da infraestrutura necessária, a instalação e configuração dos equipamentos, a integração com o sistema existente e a realização de testes operacionais, com o objetivo de assegurar o pleno funcionamento da solução.

As atividades estão sendo executadas de forma gradual, considerando as condições técnicas e operacionais específicas de cada local. O andamento das instalações e a situação atual dos pontos contemplados estão apresentados na tabela a seguir.

Local	Ponto	Situação
UPA – Via Conselheiro Antônio Prado	F2	Instalado e operando com leitura facial
Terminal Rodoviário – acesso pela Rua 32	F3	Instalado e operando com leitura facial
Terminal Rodoviário – plataformas de embarque e desembarque	F4	Instalado e operando com leitura facial
Santa Casa – entrada pela Avenida 23	F5	Em fase de implantação, conforme cronograma técnico
Santa Casa – entrada pela Rua 30	F6	Em fase de implantação, conforme cronograma técnico

A Concessionária permanece acompanhando a execução das atividades e adotando as providências necessárias para a conclusão das instalações, adequação dos pontos pendentes e plena operacionalização do projeto.

15 CONCLUSÃO

No período avaliado, foi mantida a continuidade das atividades de operação e manutenção do parque de iluminação pública, com a realização de rondas periódicas para verificação do estado geral do parque, execução das manutenções corretivas e preventivas necessárias e planejamento das próximas atividades, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato de Concessão.

Ressalta-se que a pendência remanescente refere-se à implantação da telegestão no distrito, cuja execução está prevista para a próxima etapa do cronograma.

O sistema encontra-se em pleno funcionamento na área urbana, permitindo o monitoramento individualizado do consumo energético, o registro de horas de funcionamento, a detecção de falhas em tempo real e a gestão remota de cada ponto de iluminação, contribuindo diretamente para a eficiência operacional e energética do parque.

A funcionalidade de dimerização (redução automática da potência luminosa em períodos específicos) já está disponível e será configurada em etapas, conforme definição conjunta com o Poder Concedente, visando ampliar a eficiência energética e reduzir o consumo.

Em março/24 tivemos o início da modernização da iluminação pública em maior escala avançando por todos os bairros da cidade atingindo no final de maio o total de 21.278 luminárias LED instaladas em substituição a 23.685 luminárias modernizadas, portanto redução de 2.407 luminárias no parque de iluminação, contribuindo para a redução do consumo de energia.

A modernização até 31/10/25 de **23.714** luminárias representa **100,42%** da meta do Edital de **23.615** luminárias, superando em 70 luminárias. No cadastro atualizado temos o total de no parque de IP com 23.375 luminárias e projetores incluindo praças, rotatórias, destaque e vias públicas.

Importante frisar que todas as substituições de luminárias seguem projetos luminotécnicos elaborados em conformidade com a NBR 5101/2018 conforme consta em contrato. Os projetos têm indicado que, mesmo com a redução de luminárias em diversos pontos, temos uma melhoria acentuada de iluminância e uniformidade proporcionando aos munícipes mais segurança e conforto além de contar com índices de defeitos em luminárias LED baixíssimos, menos de 0,5%, diferente das luminárias com lâmpadas de descarga cujos índices estão próximos de 5%.

Resumidamente, atendimentos realizados

Manutenção 01 a 31 Julho	
OS atendidas por canais no prazo	69
OS atendidos canais fora do prazo	0
OS atendidas por ronda	6
OS atendidas avulso	59
OS Modernização	51
OS telegestão	43
Total	228
Média tempo de atendimento canais	**34:50:26**
OS pendentes canais no prazo	3
OS pendentes canais vencidas	0
OS pendentes ronda	0
Total	3
Ronda feita ate 10/01	6350
Defeitos encontrados ronda	423
Percentual	6,66%

Dessa forma, as Notas Fiscais referentes aos serviços passaram a ser emitidas com base na PRM reajustada, observadas as condições estabelecidas, incluindo a exclusão dos serviços de usina solar fotovoltaica, que representam 32,26% da PRM, conforme disposto no Ofício CMOG nº 029/2024, de 27/03/2024.

Ressalta-se que, adicionalmente à PRM, foi realizada a medição e faturamento da Bonificação de Desempenho Energético (BDE), conforme critérios contratuais vigentes e parâmetros técnicos previamente aprovados.

Assim, foram emitidas as seguintes Notas Fiscais: Foram emitidas as seguintes Notas Fiscais, referentes aos serviços prestados e aos valores devidos no período:

No período, foram emitidas as seguintes Notas Fiscais:

Nota Fiscal	**Valor**	**Descrição**
NF nº 65	R$ 481.911,43	Serviços de iluminação pública
NF nº 66	R$ 126.067,81	Serviços de videomonitoramento
NF nº 67	R$ 101.048,40	Parcela da Bonificação por Desempenho Energético (BDE), referente à competência de julho de 2026
NF nº 68	R$ 39.420,04	Primeira de três parcelas do valor retroativo decorrente do reajuste anual de 4,264380% pelo IPCA, referente aos serviços de iluminação pública
NF nº 69	R$ 10.312,26	Primeira de três parcelas do valor retroativo decorrente do reajuste anual de 4,264380% pelo IPCA, referente aos serviços de videomonitoramento
NF nº 71	R$ 6.228,87	Serviços de geração de energia fotovoltaica, referentes ao período de 12/07/2026 a 11/08/2026, correspondente ao percentual de 32,26%
Total	**R$ 764.989,81**	**Valor total das Notas Fiscais emitidas no período**

ANEXO I

Regularidade FGTS

BARRETOS INTELIGENTE

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS -

Inscrição: 49.023.977/0001-

Razão IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A

AV SEICHO-NO-IE 420 / DISTRITO INDUSTRIAL / BARRETOS /

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2026 a 25/08/2026

Certificação Número:

Informação obtida em 03/08/2026

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ANEXO II

Regularidade Trabalhista E Previdenciária

BARRETOS INTELIGENTE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.023.977/0001-13
Certidão nº: 66461339/2026
Expedição: 03/08/2026, às 00:21:02
Validade: 30/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.023.977/0001-13, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANEXO III

Regularidade Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.023.977/0001-13

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26080106811-65
Data e hora da emissão	03/08/2026 00:18:57
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 23938/2026

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de BARRETOS, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **49.023.977/0001-13** (CNPJ)

Contribuinte: **IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A**

Endereço: **AV SEICHO NO IE 420**
DISTRITO INDUSTRIAL I

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de BARRETOS de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

BARRETOS (SP), 03 de agosto de 2026.

Certidão emitida com base no(a) Decreto 11.638 de 27 de Fevereiro de 2023.

Certidão válida até 03/09/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço https://barretos.sp.gov.br.
Certidão emitida em 03/08/2026 as 12:08:06h. - Código de Validação **U7O4A2.J6F0O1.S7Q1V7**

AVENIDA. ALMIRANTE GAGO COUTINHO, nº 500 - BARRETOS - SP - CEP 14783-200 - Fone: (17) 3612-2000
CNPJ 44.780.609/0001-04 - e-mail: cidadaoonline@barretos.sp.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A
CNPJ: 49.023.977/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:20:00 do dia 03/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2027.
Código de controle da certidão: **E414.1792.98BE.6D00**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006526080000000005

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e 65	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 05/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 05/08/2026 09:02:13	
NÚMERO DA DPS 202600001808389	**SÉRIE DA DPS** 3	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 05/08/2026 09:02:13	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR	**CNPJ / CPF / NIF**	**Indicador Municipal (Inscrição)**	**Telefone**
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	**CNPJ / CPF / NIF**	**Indicador Municipal (Inscrição)**	**Telefone**
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	**Código de Tributação Nacional/Municipal**	**Código da NBS**	**Local da Prestação / Sigla UF / País**
	14.01.01 - -	1.2001.35.00	Barretos / SP / -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Descrição do Serviço
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	**Tipo de Tributação do ISSQN**	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN**	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 481.911,43	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 14.457,34

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	**IRRF**	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**
	R$ 5.782,93	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	**CST / cClassTrib**	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF**	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 14.457,34	R$ 467.454,09	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 467,45
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 467,45	0,90%	0,90%	R$ 4.207,09

VALOR TOTAL DA NFS-e	**VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO**	**Desconto Incondicionado**	**Desconto Condicionado**
	R$ 481.911,43	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 461.671,16	R$ 4.674,54	R$ 461.671,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 14.457,34

Inf Cont: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 12/07/26 A 11/08/26 (54,87% - PRM R$ 891.311,35) Parcela com reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. 1 - O Documento de Fatura, possui 1 via eletrônica enviada ao poder concedente e ao Banco Gestor da Conta Garantia, conforme estipulado no Contrato da Conta. 2 - O Fator do Marco da concessão está apresentado conforme item 7.2 do Anexo III do contrato de concessão. 3 - O Fator de desempenho geral está apresentado conforme item 4.2 do anexo III do contrato de concessão. 4 - Depósito: 001 - Banco do Brasil - Agência: 31-0 - Conta Corrente: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA**	**Nº NFS-e / CHAVE NFS-e**
		65 / 35055001249023977000113000000000006526080000000005

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006626080000000009

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
66	05/08/2026	05/08/2026 09:15:10
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808540	3	05/08/2026 09:15:10
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço
Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 126.067,81	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 3.782,03

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 1.512,81	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 3.782,03	R$ 122.285,78	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 122,29
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 122,29	0,90%	0,90%	R$ 1.100,57

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 126.067,81	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 120.772,97	R$ 1.222,86	R$ 120.772,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 3.782,03

Inf Cont: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE 12/07/26 A 11/08/26 (12,87% - PRM R$ 891.311,35) Parcela com reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. 1 - O Documento de Fatura, possui 1 via eletrônica enviada ao poder concedente e ao Banco Gestor da Conta Garantia, conforme estipulado no Contrato da Conta. 2 - O Fator do Marco da concessão está apresentado conforme item 7.2 do Anexo III do contrato de concessão. 3 - O Fator de desempenho geral está apresentado conforme item 4.2 do anexo III do contrato de concessão. 4 - Depósito: 001 - Banco do Brasil - Agência: 31-0 - Conta Corrente: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		66 / 35055001249023977000113000000000006626080000000009

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006726080000000002

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
67	05/08/2026	05/08/2026 09:18:56
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808585	3	05/08/2026 09:18:56
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço
Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 101.048,40	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 3.031,45

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 1.212,58	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 3.031,45	R$ 98.016,95	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 98,02
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 98,02	0,90%	0,90%	R$ 882,15

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 101.048,40	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 96.804,37	R$ 980,17	R$ 96.804,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 3.031,45

Inf Cont: Bonificação de Desempenho Energético (BDE) - (mensal) conforme Contrato de Concessão Administrativa e Parecer CMOG. CONTA PARA DEPÓSITO: 001 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 31-0 CONTA CORRENTE: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 00000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		67 / 35055001249023977000113000000000006726080000000002

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006826080000000006

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
68	05/08/2026	05/08/2026 09:27:10
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808669	3	05/08/2026 09:27:10
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço
Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 39.420,04	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 1.182,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 473,04	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 1.182,60	R$ 38.237,44	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 38,24
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 38,24	0,90%	0,90%	R$ 344,14

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 39.420,04	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 37.764,40	R$ 382,38	R$ 37.764,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 1.182,60

Inf Cont: Iluminação: R$ 39.420,04 Referente à 1ª parcela de 3 do retroativo do reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, correspondente às competências de janeiro e fevereiro de 2026, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 0000000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		68 / 35055001249023977000113000000000006826080000000006

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000006926080000000000

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
69	05/08/2026	05/08/2026 09:30:08
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001808691	3	05/08/2026 09:30:08
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço
Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 10.312,26	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 309,37
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	**IRRF**	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**
	R$ 123,74	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	**CST / cClassTrib**	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF**	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 309,37	R$ 10.002,89	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 10,00
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 10,00	0,90%	0,90%	R$ 90,03
VALOR TOTAL DA NFS-e	**VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO**	**Desconto Incondicionado**	**Desconto Condicionado**
	R$ 10.312,26	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 9.879,15	R$ 100,03	R$ 9.879,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 309,37

Inf Cont: Telecomunicações: R$ 10.312,26 Referente à 1ª parcela de 3 do retroativo do reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, correspondente às competências de janeiro e fevereiro de 2026, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 000000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		69 / 35055001249023977000113000000000006926080000000000

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000007126080000000003

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
71	05/08/2026	05/08/2026 16:10:10
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600001812363	3	05/08/2026 16:10:10
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	07.02.01 - -	1.0101.11.00	Barretos / SP / -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Descrição do Serviço
Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (ex

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 6.228,87	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 186,87

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 74,74	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 186,87	R$ 6.042,00	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 6,04
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 6,04	0,90%	0,90%	R$ 54,38

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 6.228,87	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 5.967,26	R$ 60,42	R$ 5.967,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 186,87

Inf Cont: SERVIÇOS DE FOTOVOLTAICA DE 12/07/26 A 11/08/26 (32,26% - PRM R$ 891.311,35) 1 - O Documento de Fatura, possui 1 via eletrônica enviada ao poder concedente e ao Banco Gestor da Conta Garantia, conforme estipulado no Contrato da Conta. 2 - O Fator do Marco da concessão está apresentado conforme item 7.2 do Anexo III do contrato de concessão. 3 - O Fator de desempenho geral está apresentado conforme item 4.2 do anexo III do contrato de concessão. 4 - Depósito: 001 - Banco do Brasil - Agência: 31-0 - Conta Corrente: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA | **Cod Obra:** 00000

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		71 / 35055001249023977000113000000000007126080000000003
