BARRETOS INTELIGENTE

Barretos- SP, 08 de Setembro de 2026.

À

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barretos

A/C

Sr. Luís Carlos Diniz Buch Secretário

de Finanças

CMOG – COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO

REF.: Relatório Mensal de Agosto e Notas Fiscais NF 72, NF 73, NF 74, NF 75, NF 76 e NF 77 – Parcela 42 e pagamento da parcela de Agosto do BDE.

A IP Barretos Concessionária de Cidade Inteligente S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 49.023.977/0001-13, vem, por meio deste, encaminhar o Relatório Mensal referente ao mês de Agosto/2026, bem como as respectivas Notas Fiscais nº 72, 73, 74, 75, 76 e 77, de cobrança dos serviços prestados, correspondentes à Parcela 42, conforme discriminado a seguir:

Nota Fiscal	Valor	Descrição
NF nº 72	R$ 126.067,81	Serviços de videomonitoramento
NF nº 73	R$ 481.911,43	Serviços de iluminação pública
NF nº 74	R$ 6.228,87	Serviços de geração de energia fotovoltaica, referentes ao mês de agosto de 2026, faturados proporcionalmente à capacidade efetivamente implantada, entregue e em operação, no âmbito da parcela contratual de 32,26% da PRM
NF nº 75	R$ 39.420,04	Segunda de três parcelas do valor retroativo decorrente do reajuste anual de 4,264380% pelo IPCA, referente aos serviços de iluminação pública, correspondente às competências de janeiro e fevereiro de 2026
NF nº 76	R$ 10.312,26	Segunda de três parcelas do valor retroativo decorrente do reajuste anual de 4,264380% pelo IPCA, referente aos serviços de videomonitoramento, correspondente às competências de janeiro e fevereiro de 2026
NF nº 77	R$ 102.076,18	Parcela da Bonificação por Desempenho Energético (BDE), referente à competência de agosto de 2026
Total	**R$ 766.016,59**	**Valor total das Notas Fiscais emitidas no período**

No que se refere à Nota Fiscal nº 77, relativa à Bonificação de Desempenho Energético (BDE), no valor de R$ 102.076,18, referente à competência de agosto de 2026, esclarece-se que sua apuração observou integralmente a metodologia validada pelo Verificador Independente e deliberada por este Comitê, mantendo-se os parâmetros técnicos já aprovados, com aplicação da tarifa unitária de energia elétrica (R$/kWh) e do percentual de eficiência energética apurado, sem inclusão de tributos, conforme demonstrativo de cálculo apresentado no Relatório Mensal em anexo. A aplicabilidade da Bonificação no período foi ratificada pelo Verificador Independente, que apurou, no Índice de Eficientização (IE), redução de 75,95% no consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública, percentual superior ao mínimo de 60% exigido pelo Anexo 3 do Contrato de Concessão para aplicação do BDE.

Em consonância com o Relatório Trimestral de Avaliação do Desempenho da Concessionária, emitido pelo Verificador Independente (Ernst & Young) em 17 de agosto de 2026 e referente ao trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2026, foi apurado Índice de Desempenho (ID) de 0,15, do que resulta Fator de Desempenho Geral (FDG) igual a 1,00, nos termos da fórmula FDG = 0,85 + ID. As Notas Fiscais ora apresentadas foram, portanto, emitidas com a aplicação do Fator de Desempenho Geral (FDG) igual a 1,00.

Quanto às Usinas Solares Fotovoltaicas, informa-se que o faturamento foi retomado de forma proporcional ao percentual efetivamente implantado, entregue e em operação, na forma da estrutura de remuneração do 3º Marco acordada com este Comitê e registrada na ata da reunião do CMOG de 25 de junho de 2026. A Nota Fiscal nº 74 reflete, portanto, a fração da capacidade atualmente em operação, apurada conforme a planilha de rateio que acompanha o Relatório Mensal. À medida que novas usinas entrarem em funcionamento, o percentual e o valor faturado serão progressivamente atualizados, até atingir a parcela total de 32,26% da PRM prevista contratualmente.

Permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 08/09/2026 08:37:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S.A.
MARCELA APARECIDA ALFINETE
GESTORA DO CONTRATO

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000072260900000000004

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
72	04/09/2026	04/09/2026 13:26:34
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600002132127	3	04/09/2026 13:26:34
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177

Nome / Nome Empresarial
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783

Endereço
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I

E-mail
financeiro@barretosinteligente.com.br

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não Optante	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
44.780.609/0001-04	000000000001	

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783

Endereço
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS

E-mail
antonioconti@arpeggio.com.br

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.01.01 - -	1.2001.10.00	Barretos / SP / -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Descrição do Serviço
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 126.067,81	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 3.782,03

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 1.512,81	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 3.782,03	R$ 122.285,78	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 122,29
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 122,29	0,90%	0,90%	R$ 1.100,57

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 126.067,81	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 120.772,97	R$ 1.222,86	R$ 120.772,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 3.782,03

Inf Cont: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE 12/08/26 A 11/09/26 (12,87% - PRM R$ 891.311,35) Parcela com reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. 1 - O Documento de Fatura, possui 1 via eletrônica enviada ao poder concedente e ao Banco Gestor da Conta Garantia, conforme estipulado no Contrato da Conta. 2 - O Fator do Marco da concessão está apresentado conforme item 7.2 do Anexo III do contrato de concessão. 3 - O Fator de desempenho geral está apresentado conforme item 4.2 do anexo III do contrato de concessão. 4 - Depósito: 001 - Banco do Brasil - Agência: 31-0 - Conta Corrente: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		72 / 35055001249023977000113000000000072260900000000004

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000007326090000000008

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
73	04/09/2026	04/09/2026 13:31:58
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600002132136	3	04/09/2026 13:31:58
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177

Nome / Nome Empresarial
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783

Endereço
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I

E-mail
financeiro@barretosinteligente.com.br

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não Optante	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
44.780.609/0001-04	000000000001	

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783

Endereço
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS

E-mail
antonioconti@arpeggio.com.br

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.01.01 - -	1.2001.10.00	Barretos / SP / -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Descrição do Serviço
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 481.911,43	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 14.457,34

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 5.782,93	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 14.457,34	R$ 467.454,09	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 467,45
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 467,45	0,90%	0,90%	R$ 4.207,09

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 481.911,43	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 461.671,16	R$ 4.674,54	R$ 461.671,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 14.457,34

Inf Cont: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 12/08/26 A 11/09/26 (54,87% - PRM R$ 891.311,35) Parcela com reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. 1 - O Documento de Fatura, possui 1 via eletrônica enviada ao poder concedente e ao Banco Gestor da Conta Garantia, conforme estipulado no Contrato da Conta. 2 - O Fator do Marco da concessão está apresentado conforme item 7.2 do Anexo III do contrato de concessão. 3 - O Fator de desempenho geral está apresentado conforme item 4.2 do anexo III do contrato de concessão. 4 - Depósito: 001 - Banco do Brasil - Agência: 31-0 - Conta Corrente: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		73 / 35055001249023977000113000000000007326090000000008

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000007426090000000001

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e	
74	04/09/2026	04/09/2026 13:34:58	
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**	
202600002132141	3	04/09/2026 13:34:58	
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**	
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	14.01.01 - -	1.2001.10.00	Barretos / SP / -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Descrição do Serviço
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 6.228,87	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 186,87

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 74,74	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 186,87	R$ 6.042,00	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 6,04
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 6,04	0,90%	0,90%	R$ 54,38

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 6.228,87	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 5.967,26	R$ 60,42	R$ 5.967,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 186,87

Inf Cont: SERVIÇOS DE FOTOVOLTAICA DE 12/08/26 A 11/09/26 (32,26% - PRM R$ 891.311,35) 1 - O Documento de Fatura, possui 1 via eletrônica enviada ao poder concedente e ao Banco Gestor da Conta Garantia, conforme estipulado no Contrato da Conta. 2 - O Fator do Marco da concessão está apresentado conforme item 7.2 do Anexo III do contrato de concessão. 3 - O Fator de desempenho geral está apresentado conforme item 4.2 do anexo III do contrato de concessão. 4 - Depósito: 001 - Banco do Brasil - Agência: 31-0 - Conta Corrente: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		74 / 35055001249023977000113000000000007426090000000001

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000007526090000000005

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e	
75	04/09/2026	04/09/2026 13:37:22	
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.
202600002132170	3	04/09/2026 13:37:22	
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**	
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A	Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço	**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I	financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço	**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS	antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.01.01 - -	1.2001.10.00	Barretos / SP / -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Descrição do Serviço
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 39.420,04	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 1.182,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 473,04	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 1.182,60	R$ 38.237,44	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 38,24
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 38,24	0,90%	0,90%	R$ 344,14

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 39.420,04	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 37.764,40	R$ 382,38	R$ 37.764,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 1.182,60

Inf Cont: Iluminação: R$ 39.420,04 Referente à 2ª parcela de 3 do retroativo do reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, correspondente às competências de janeiro e fevereiro de 2026, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		75 / 35055001249023977000113000000000007526090000000005

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000007626090000000009

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
76	04/09/2026	04/09/2026 13:39:04
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600002132175	3	04/09/2026 13:39:04
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	14.01.01 - -	1.2001.10.00	Barretos / SP / -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Descrição do Serviço
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 10.312,26	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 309,37

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 123,74	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 309,37	R$ 10.002,89	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 10,00
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 10,00	0,90%	0,90%	R$ 90,03

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 10.312,26	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 9.879,15	R$ 100,03	R$ 9.879,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 309,37

Inf Cont: Telecomunicações: R$ 10.312,26 Referente à 2ª parcela de 3 do retroativo do reajuste anual pelo IPCA de 4,264380%, correspondente às competências de janeiro e fevereiro de 2026, conforme Termo de Apostilamento do Contrato nº 14/2023. | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		76 / 35055001249023977000113000000000007626090000000009

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Barretos / SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35055001249023977000113000000000007726090000000002

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
77	04/09/2026	04/09/2026 15:48:59
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
202600002133233	3	04/09/2026 15:48:59
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	49.023.977/0001-13	230105000011	(13) 3877-0177
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV SEICHO NO IE, 420, DISTRITO INDUSTRIAL I		financeiro@barretosinteligente.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Não Optante	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	44.780.609/0001-04	000000000001	
Nome / Nome Empresarial		**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		Barretos / SP	35.05500 / 14.783-783
Endereço		**E-mail**	
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 500, RIOS		antonioconti@arpeggio.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	14.01.01 - -	1.2001.10.00	Barretos / SP / -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Descrição do Serviço
Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação tributável	Barretos / SP / -	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 102.076,18	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 3.062,29

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R$ 1.224,91	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**	
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	000 / 000001	100101 / 3505500 / Barretos / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 3.062,29	R$ 99.013,89	- / - / -	0,10% / 0,00%
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00%	R$ 0,00	0,10%	R$ 99,01
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 99,01	0,90%	0,90%	R$ 891,13

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R$ 102.076,18	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 97.788,98	R$ 990,14	R$ 97.788,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 3.062,29

Inf Cont: Bonificação de Desempenho Energético (BDE) - (mensal) conforme Contrato de Concessão Administrativa e Parecer CMOG. CONTA PARA DEPÓSITO: 001 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 31-0 CONTA CORRENTE: 64276-2 | **Nome:** IP BARRETOS CONCESSIONARIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		77 / 35055001249023977000113000000000007726090000000002

RELATÓRIO MENSAL
AGOSTO/2026



BARRETOS
INTELIGENTE

GESTÃO POR MEIO DE PPP

BARRETOS
PREFEITURA

BARRETOS INTELIGENTE

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO MENSAL

REFERENTE A

Agosto/2026

Objeto: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E USINA FOTOVOLTAICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

Data de assinatura: 11 de janeiro de 2023.
Município Atendido: Barretos/SP
Parque de Iluminação Pública: 23.615 pontos
Iluminação de Destaque: 535 equipamentos
Infraestrutura de Fibra Óptica: 80,7 km | 165 pontos na zona urbana
Infraestrutura de Rádio: raio de 31,3 km | 18 pontos na zona rural
Videomonitoramento: 84 câmeras em 40 pontos de monitoramento
WiFi público: 28 pontos | 10 usuários com no mínimo 5 Mbps ao mesmo tempo
Geração de Energia: 5.855.970,04 kWh/ano | atender 319 unidades consumidoras

BARRETOS INTELIGENTE

Barretos, 08 de Setembro de 2026

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

CMOG – COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO

VERIFICADOR INDEPENDENTE – ERNST & YOUNG

Este Relatório visa apresentar as atividades dos compromissos acordados no CONTRATO DE CONCESSÃO nº 14-2023, referente aos SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E USINA FOTOVOLTAICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

Estamos à disposição para quaisquer modificações e/ou correções que se fizerem necessárias.

Responsáveis Técnicos:

Engº EDSON JOSE LOPES DAS NEVES

Engº FABRICIO MOREIRA MELLO RIBEIRO

Engº PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARAES

Engº PEDRO CICCI CUNHA CASTRO

Engº REGIS HONORIO

Engº JULIO JOSÉ ALVARES LOPES DAS NEVES

A IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A, responsável pela execução dos SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP, através de CONTRATO DE CONCESSÃO Administrativa nº 14-2023 na modalidade PPP (Parceria Público Privada) apresenta ao COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO - CMOG e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE relatório das suas atividades técnicas, realizadas no período de 01/08/2026 a 31/08/2026.

1. REGULARIDADES CONTRATUAL

1.1 Regularidade FGTS – ANEXO I

1.2 Regularidade Trabalhista e Previdenciária – ANEXO II

1.3 Regularidade Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal – ANEXO III

1.4 Garantia de Execução do Contrato – ANEXO IV

1.5 Relatório de Segurança

2. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1. Evolução Mensal da Taxa de Falha por região da cidade (norte, sul, leste, oeste, centro), desde julho/2023 - (ideal < 4%).

Regiões	Total de Pontos Cadastrados	Quantidade de Chamados/Atendimentos
Norte	4946	3527
Sul	7399	5799
Leste	5637	3607
Oeste	3021	2979
Centro	2603	1362
Total	23606	17274

Imagem 1: total de pontos cadastrados e quantidade de chamados/atendimentos por região.

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS						
Mês	Norte	Sul	Leste	Oeste	Centro	Total
Julho	391	450	185	291	85	1402
Agosto	388	417	260	263	241	1569
Setembro	305	319	275	193	107	1199
Outubro	208	452	304	233	80	1277
Novembro	216	360	185	220	76	1057
Dezembro	241	325	142	160	90	958
Janeiro	227	241	182	157	70	877
Fevereiro	140	216	115	152	61	684
Março	143	237	201	101	42	724
Abril	173	314	151	146	48	832
Maio	169	189	101	93	33	585
Junho	106	198	70	58	17	449
Julho	41	171	65	36	8	321
Agosto	37	94	37	33	19	220
Setembro	32	100	52	19	5	208
Outubro	36	78	53	38	21	226
Novembro	49	124	32	39	29	273
Dezembro	24	85	36	51	16	212
Janeiro	39	93	145	50	13	340
Fevereiro	30	52	70	51	16	219
Março	44	83	72	42	45	286
Abril	41	121	71	65	44	342
Maio	84	99	92	36	21	332
Junho	31	57	60	24	9	181
Julho	38	88	53	68	9	256
Agosto	17	50	39	19	13	138
Setembro	17	80	45	24	27	193
Outubro	20	42	37	26	22	147
Novembro	15	33	63	22	3	136
Dezembro	6	25	38	16	2	87
Janeiro	22	51	34	21	15	143
Fevereiro	26	136	72	40	12	286
Março	19	68	68	16	9	180
Abril	31	74	40	28	13	186
Maio	30	40	33	34	10	147
Junho	14	36	37	13	6	106
Julho	23	63	53	30	8	177
Agosto	54	138	39	71	17	319

Imagem 2: quantidade de atendimentos realizados por região em cada mês vigente do contrato desde Julho/2023.

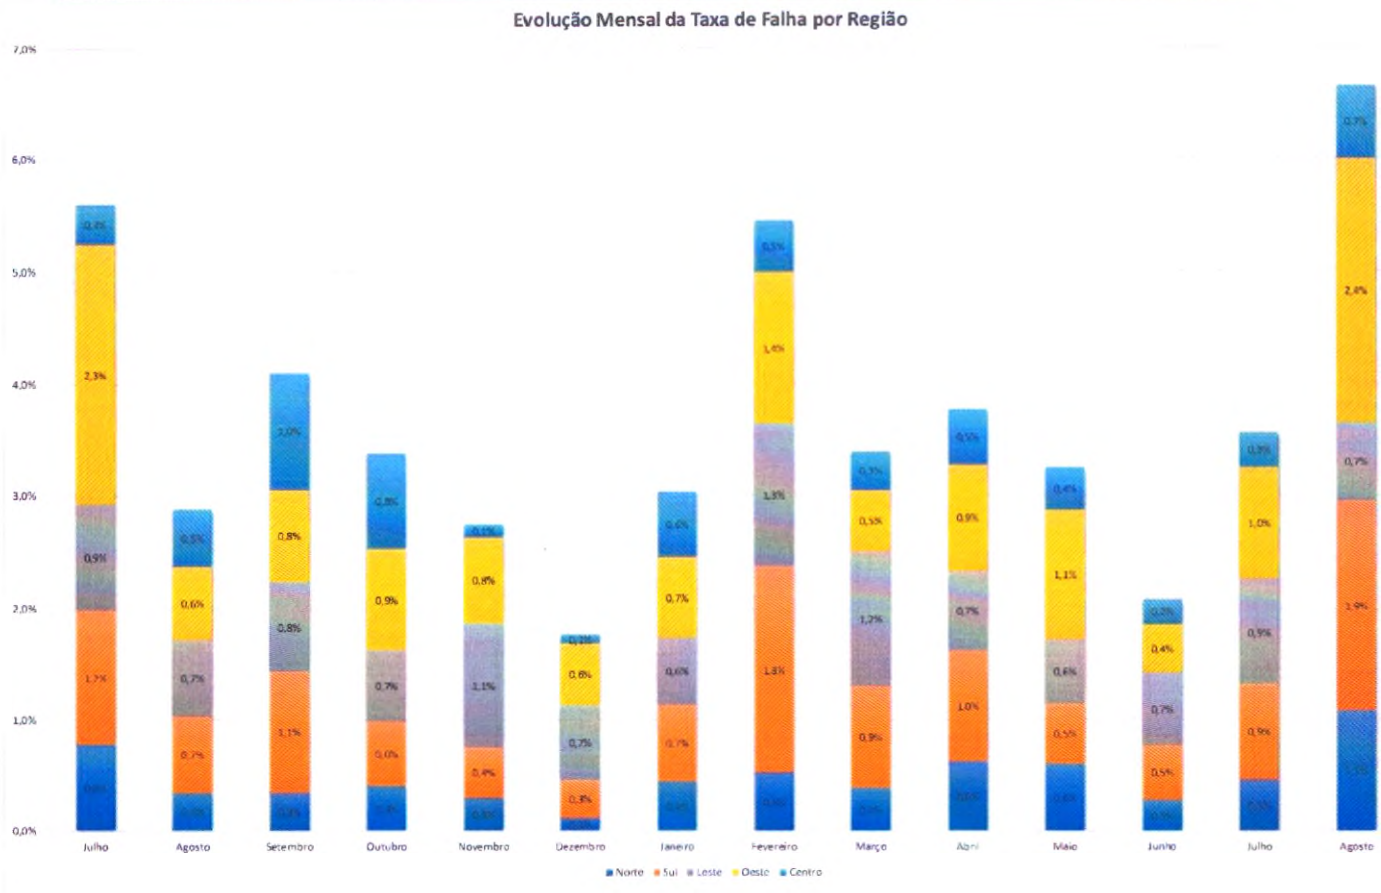


Imagem 3: gráfico de evolução mensal da taxa de falha mensal por região.

2.2. Evolução Mensal do número de chamados resolvidos por canal:

i. Call Center 0800
ii. Aplicativo
iii. Site
iv. Ronda e Avulsos

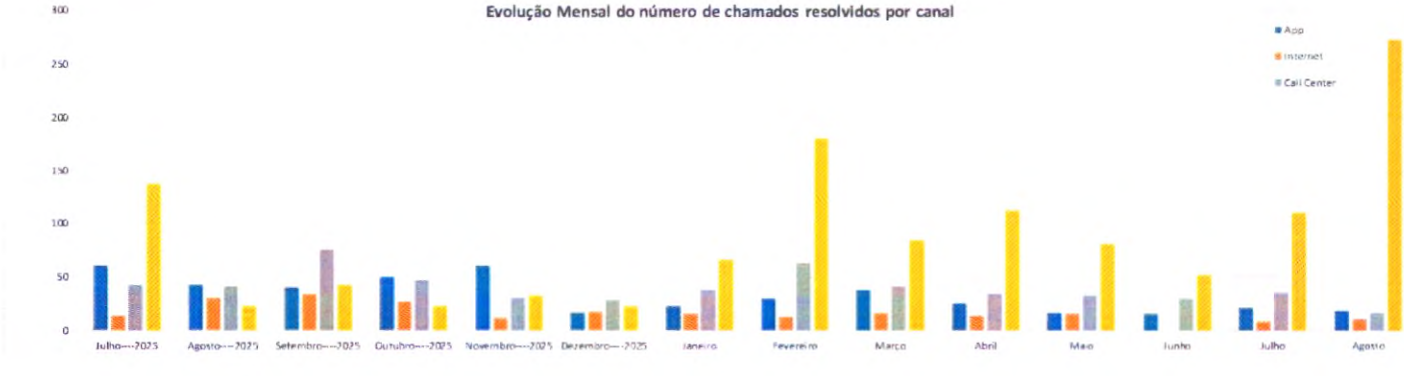


Imagem 4: gráfico de evolução mensal de chamados resolvidos por canal de atendimento.

2.3 Evolução Mensal do Tempo Médio de Atendimento

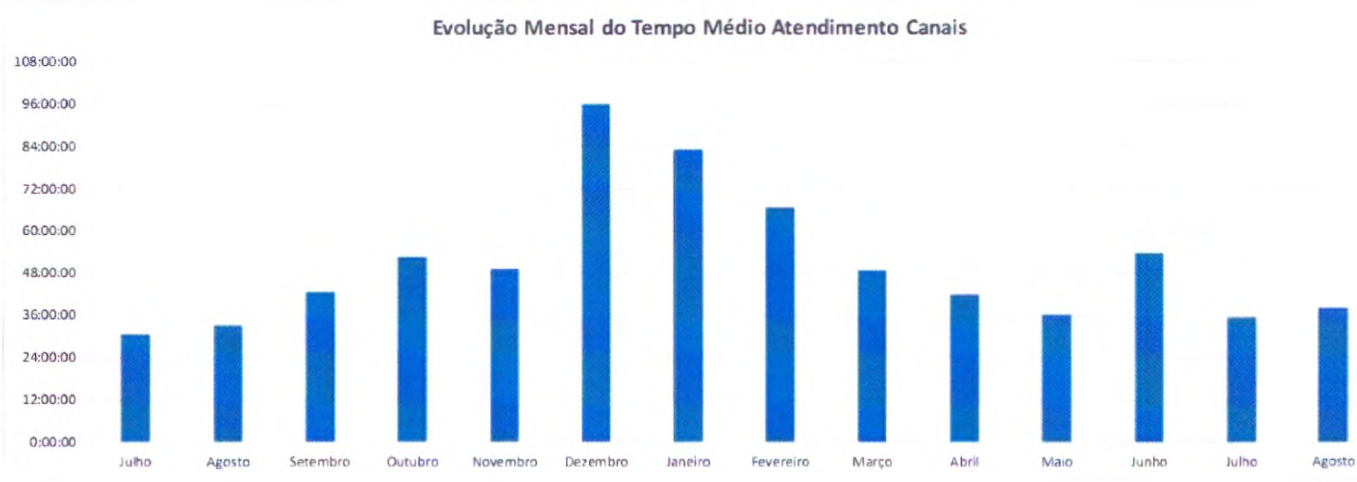


Imagem 5: gráfico de evolução mensal do tempo médio dos atendimentos via canais.

Prazo contratual: 168 horas.

3 IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED – 23.615 UNIDADES

a. Informação sobre o Projeto Executivo – Aprovação e dificuldades encontradas

Os projetos executivos da modernização do parque de IP foram concluídos e feitos com base na classificação das Vias informada no Termo de Referência do processo licitatório. A classificação das vias varia de V1 a V5 conforme a NBR5101/2018, sendo V1 classificada como as vias principais de grande fluxo de carros e V5 classificadas como vias locais de bairros com pouco fluxo de carros. Foram seguidas as classificações informadas no Projeto Básico do Edital, porém notamos que houve necessidade de reclassificações que informamos em 1º Ofício enviado ao CMOG em 12/03/24 e em 2º Ofício enviado ao CMOG em 11/07/24. Em 20/06/24, em resposta ao Ofício 040/24 do CMOG de 01/06/24, encaminhamos novas considerações a respeito das classificações das vias. Ao final dos projetos foram reclassificados 4.882 pontos de iluminação em diversas Ruas e Avenidas da cidade. Vamos elaborar os estudos para avaliar o impacto financeiro destas reclassificações.

Esclarecendo: por exemplo, Bairros inteiros como o San Diego, São Francisco, Jardim Califórnia, Jardim Anastácio e outros, onde a classificação de Via está como V5 no Edital, no local temos luminárias instaladas de 250W típicas de vias V2, assim, projetamos como V2 colocando luminárias de LED de 70W mantendo o equilíbrio de luminosidade, e ainda com economia de 75% do consumo de energia. Ao contrário, se projetarmos como V5 como está no Termo de Referência, colocaríamos luminárias LED de 30W, atenderia a Norma 5101, mas diminuiria em muito a iluminância média o que causaria insatisfação muito grande dos munícipes que já estão habituados com uma luminosidade melhor. **Região central, outro exemplo, teríamos a maioria como V5 e foram reclassificadas para V2**. Não são casos isolados e sim bairros inteiros. Há muitos outros bairros na mesma situação.

As reclassificações de Vias demandam luminárias de maior potência do que as originalmente previstas no Edital e, portanto, serão objeto de Reequilíbrio Econômico-Financeiro – REF. Para além do investimento maior em luminárias, também haverá maior consumo de energia,

consequentemente a apuração da Bonificação de Desempenho Energético (BDE) também será menor havendo necessidade de recomposição.

REF é um procedimento muito comum em projetos modelo PPP. Chegamos ao final da modernização das vias e não ocorreram novas reclassificações.

No quadro abaixo temos as potências das luminárias que foram entregues pelo fabricante até 28/11/24 atendendo à demanda de projetos. Devido à não reclassificação de novas vias, e seguindo os projetos originais do Edital, onde temos grande quantidade de Vias V5, destaca-se a luminária de 30W:

luminárias entregues até 28/novembro/24										
pot (W)	lote 1	lote 2	lote 3	lote 4	lote 5	lote 6	lote 7	lote 8	lote 9	TOTAL
30W	1010	1767		500	1500	500		656	26	5959
40W		505							4	509
50W		505		200	500	800	1000		20	3025
60W		505							1	506
70W	1010	1155	2000	1500	200				279	6144
80W	1010									1010
90W		252		800	400		150	362	164	2128
110W		121								121
120W		232		600	500		350	911	163	2756
TOTAL	3030	5042	2000	3600	3100	1300	1500	1929	657	**22158**

Em 28/11/25 recebemos o ÚLTIMO lote (9) destinado a modernizações de praças, futuras expansões e manutenções.

Foram encaminhadas à CPFL até 31/maio, 71 lotes de substituições feitas para a atualização do cadastro e contas de consumo. **Estamos aguardando a finalização das atualizações e o impacto nas novas contas de consumo. Até 31 de maio/25 as contas da CPFL apresentavam redução de consumo de 60,95% - Anexo VI.**

b. Quantitativo implantado (Cronograma x Realizado)

Resumo do realizado nas substituições para modernização com LED até 30/Agosto:

resumo modernização até Agosto/26	
Total de Pontos Luminosos EDITAL	23.615
Total de Pontos Modernizados:	23735
Redução de Pontos	2417
Pontos instalados LED	21318
Percentual Modernizado no período	100,51%
Percentual Redução de Carga:	75,99%
Carga anterior (kWatt)	5698,19
Carga instalada (kWatt)	1367,898

Notar que a eficientização do parque de IP, além da redução do consumo de energia e outros benefícios da tecnologia LED, promoveu uma redução de 2.419 luminárias.

Do total de luminárias retiradas do parque de IP (23.714), temos:

- Vapor de sódio e Vapor metálico: 22.120 – LED: 1.594

Destacamos que já ultrapassamos a quantidade de luminárias modernizadas estipuladas no Edital, superando em 99 luminárias, ou seja, 100,42%.

Temos ainda alguns casos de luminárias que não foram modernizadas que se concentram em praças e rotatórias. As chuvas também impossibilitam a entrada dos caminhões nas praças pois danificam os gramados. Outros impedimentos como presença de abelhas nos postes/estruturas, próximos de rede primária (alta tensão) e necessidade de poda de árvores.

Vias Públicas do município já estão ***100% modernizadas***.

A Concessionária encaminhou regularmente os relatórios e documentos necessários à aferição

dos indicadores. No período, o Verificador Independente emitiu, em 17 de agosto de 2026, o Relatório Trimestral de Avaliação do Desempenho da Concessionária referente ao trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2026.

Todos os sete indicadores que compõem o Índice de Desempenho foram pontuados no valor máximo previsto no Anexo 3, resultando em Índice de Desempenho (ID) de 0,15 e Fator de Desempenho Geral (FDG) igual a 1,00. Destacam-se o Indicador de Velocidade Média de Conexão (IVC), com 0% de não conformidade em 144 pontos avaliados, o Indicador de Atendimento e Manutenção de Iluminação Pública (IAM-IP), com 278 chamados avaliados e nenhum atendido fora do prazo, e o Indicador de Gravação de Imagens (IGI), sem relatórios não conformes.

No que se refere ao Indicador de Satisfação do Serviço RD (ISS-RD), o Verificador Independente apurou 7 respostas, das quais 6 classificadas como "Bom" ou "Ótimo", correspondentes a 85,71% de avaliação positiva, com atribuição da nota máxima de 0,015. Fica assim superada a divergência apontada por esta Concessionária em relatórios anteriores quanto ao resultado deste indicador.

A Concessionária reitera, contudo, a observação de ordem metodológica já registrada: a amostragem de 7 respostas é reduzida para fins de representatividade estatística, e a pesquisa não vem acompanhada do detalhamento dos critérios de seleção, abrangência e forma de coleta dos dados. Sugere-se a ampliação da base de respondentes nos próximos ciclos de aferição.

Registra-se, ainda, que a análise técnica das ordens de serviço evidencia que os registros operacionais contemplam ocorrências de naturezas distintas, incluindo situações não relacionadas diretamente à qualidade da rede, o que reforça a necessidade de avaliação integrada dos indicadores e da correta classificação das ocorrências.

Reitera-se, por fim, o compromisso da Concessionária com a transparência, a qualidade dos serviços prestados e a melhoria contínua dos processos operacionais, permanecendo à disposição para esclarecimentos adicionais e para análise técnica conjunta dos dados apresentados.

4 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO (BDE) e Índice de Eficientização (IE)

A Bonificação de Desempenho Energético (BDE) vem sendo apurada conforme os critérios contratuais estabelecidos, considerando a economia de energia efetivamente comprovada no período avaliado. O valor do bônus tem sido calculado com base na diferença entre o consumo inicial de referência e o consumo eficientizado após a modernização do parque de iluminação, refletindo o desempenho alcançado pela Concessionária na redução do consumo energético.

Premissas e Metodologia de Cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE)

a. Base conceitual do cálculo

O cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE) fundamenta-se na comparação entre o **Consumo Específico Original (CE_0)** e o **Consumo Específico Efetivo (CE_ef)** do parque de iluminação pública, após a implantação das ações de eficientização energética.

b. Índice de eficiência energética (EE)

A eficiência energética é apurada por meio da seguinte relação:

$$EE = 1 - (CE_ef / CE_0) \times t \times 100\%$$

Onde t representa o fator de ajuste proporcional à variação da potência instalada (ip_t / ip_0).

c. Cálculo do consumo específico médio

O consumo específico médio considera a relação entre consumo de energia e potência instalada:

- $CE_{m0} = CE_0 / ip_0$
- $CE_{me}f = CE_ef / ip_t$

d. Apuração do percentual de eficiência alcançado

Aplicando os valores apurados no período de referência, foi identificado um **percentual de eficiência energética de 76,29%**, superando a meta mínima contratual.

e. Cálculo da energia efetivamente economizada

A energia economizada (kWh) é calculada pela diferença entre o consumo original e o consumo efetivo, multiplicada pelos dias do mês e pelo tempo médio de operação:

- Energia Economizada (kWh) = $(CE_0 - CE_ef) \times$ nº de dias $\times T_{mi}$

Definição da meta de economia contratual

A meta de economia corresponde a 60% do consumo original, conforme previsto contratualmente:

Meta de Economia (kWh) = $CE_0 \times 60\% \times$ nº de dias $\times T_{mi}$

Cálculo do excedente de economia

O excedente passível de bonificação corresponde à diferença positiva entre a energia economizada e a meta contratual:

Excedente = Energia Economizada − Meta de Economia

Cálculo do valor financeiro da bonificação

O valor do repasse financeiro é obtido pela aplicação do percentual de excedente sobre a tarifa média do período:

Valor do Repasse (R$) = Excedente × % Excedente × Tarifa média mensal

Parâmetros tarifários e temporais

Foram considerados:

Tarifa média mensal aplicável ao

período; Quantidade de dias de cada

mês;

Tempo médio diário de funcionamento do parque de iluminação.

Validação técnica


As premissas, fórmulas e resultados do cálculo foram avaliados e validados pelo Verificador Independente, servindo de base para a deliberação administrativa do CMOG.

Para o período avaliado, foram considerados os seguintes critérios:

- **Mês avaliado: Agosto**
- **Quantidade de dias:** conforme mês civil
- **Tarifa de energia elétrica:** composta pelos componentes tarifários **TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição)** e **TE (Tarifa de Energia)**, conforme faturas da concessionária de energia elétrica, **sem inclusão de tributos**, encargos ou retenções fiscais;
- **Tarifa de energia com tributos:** utilizada apenas para fins informativos, não integrando a base de cálculo da bonificação;
- **Valor Inicial (kWh):** correspondente ao consumo de referência do parque de iluminação pública;

- **Valor Eficientizado (kWh):** correspondente ao consumo efetivo após a implantação das medidas de eficiência energética;
- **Valor Economizado (kWh):** diferença apurada entre o consumo de referência e o consumo eficientizado;
    - **Meta de Economia:** fixada contratualmente em **60%** do consumo de referência;
- **Percentual de eficiência energética (EE):** mantido em **76,29%**, uma vez que não houve alteração na potência instalada (kW) nem nos parâmetros operacionais do parque.

BARRETOS
INTELIGENTE

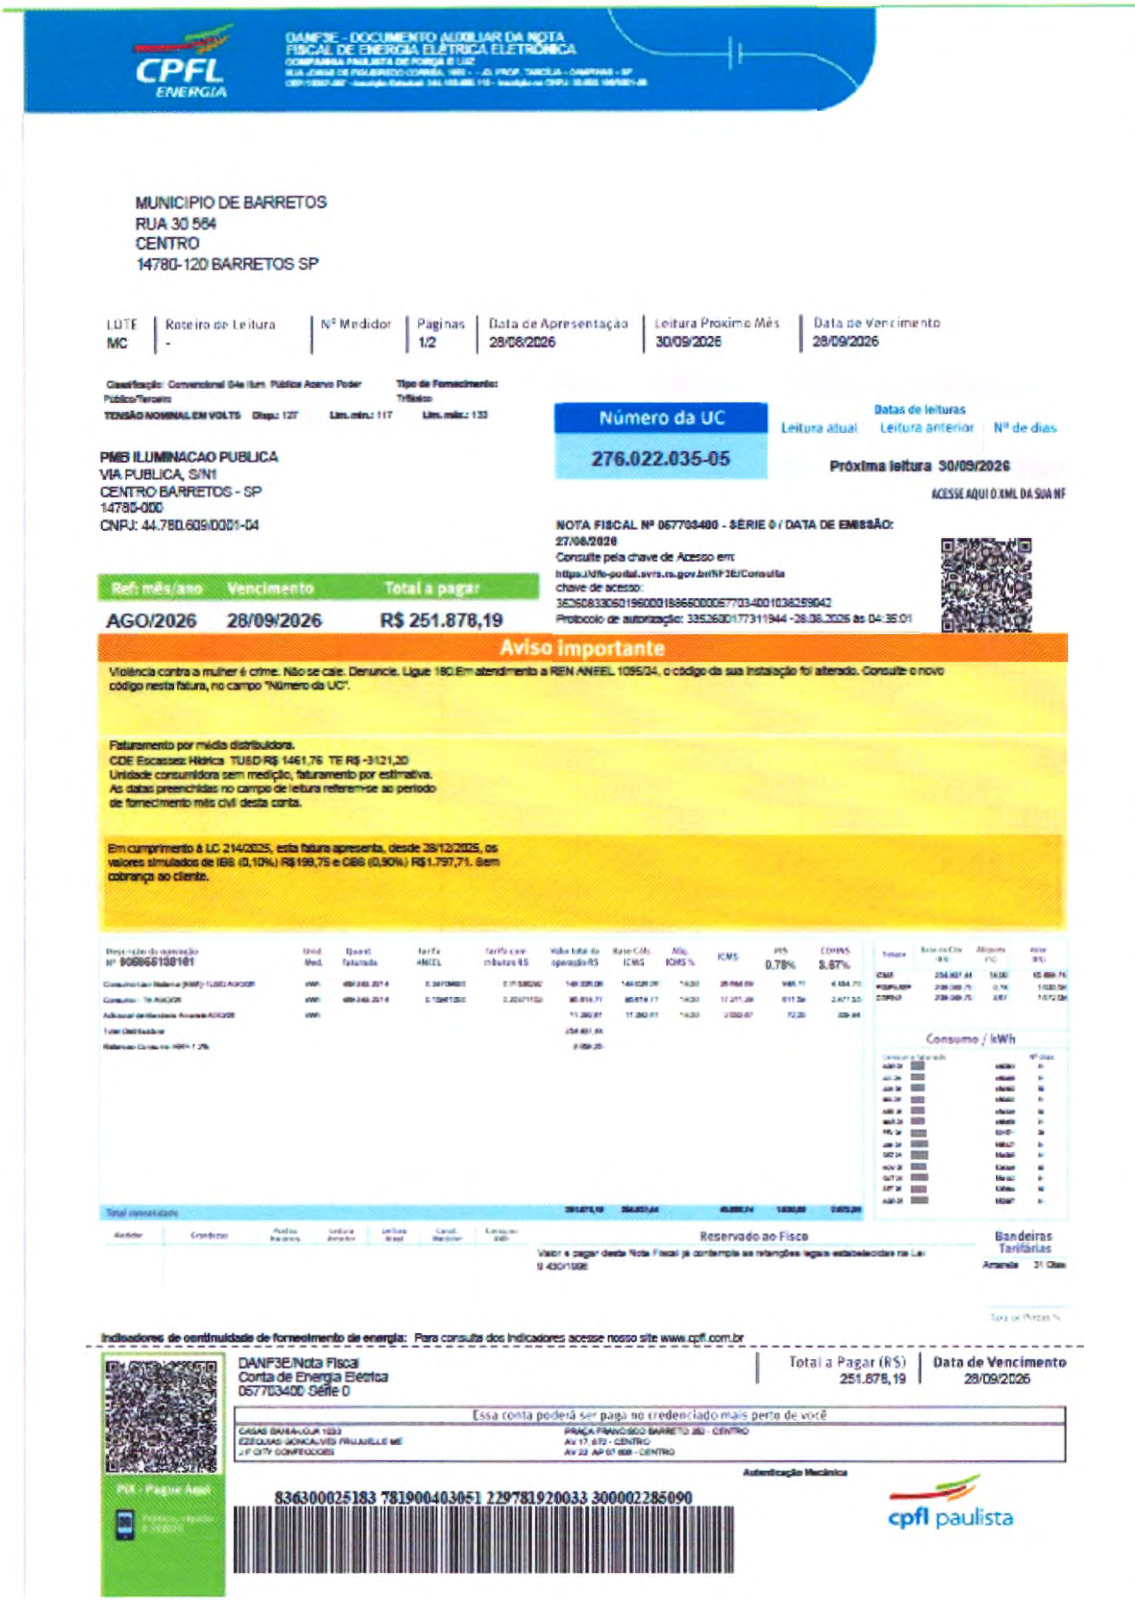

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE BARRETOS
RUA 30 564
CENTRO
14780-120 BARRETOS SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Paginas	Data de Apresentação	Leitura Proximo Mês	Data de Vencimento
MC	-		1/2	28/08/2026	30/09/2026	28/09/2026

Classificação: Convencional B4a Ilum. Pública Asserv Poder Público/Terceiro | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

PMB ILUMINACAO PUBLICA
VIA PUBLICA, S/N1
CENTRO BARRETOS - SP
14780-000
CNPJ: 44.780.609/0001-04

Número da UC: 276.022.035-05

Datas de leituras: Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias

Próxima leitura 30/09/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 057703400 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/08/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260833060196000186660000577034001038259042
Protocolo de autorização: 335260017731 1944 - 28.08.2026 às 04:35:01

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	28/09/2026	R$ 251.878,19

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Faturamento por média distribuidora.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1461,76 TE R$ -3121,20
Unidade consumidora sem medição, faturamento por estimativa.
As datas preenchidas no campo de leitura referem-se ao período de fornecimento mês civil desta conta.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$199,75 e CBS (0,90%) R$1.797,71. Sem cobrança ao cliente.

Descrição do serviço Nº 9086651381O1 | Unid. Med. | Quant. Faturada | Tarifa ANEEL | Tarifa com tributos R$ | Valor total da operação R$ | Base Cálc. ICMS | Alíq. ICMS % | ICMS | PIS 0,78% | COFINS 3,67%

Consumo / kWh

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 31 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057703400 Série 0

Total a Pagar (R$) 251.878,19 | Data de Vencimento 28/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASAS BAHIA-OUR 1033 — PRAÇA FRANCISCO BARRETO 252 - CENTRO
EZEQUIAS GONCALVES PAULELLE ME — Av 17, 672 - CENTRO
J F CITY CONFECCOES — Av 23 AP 07 668 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

836300025183 781900403051 229781920033 300002285090

cpfl paulista

Consórcio IP Barretos

Av. Seicho No Ie, 420, Distrito Industrial, Barretos/SP, CEP: 14.783-033

Mês avaliado	#dias	Tarifa de Energia - TUSD	Tarifa de Energia - TE	Tarifa de Energia (com tributos)	Valor Inicial (KWH)	Valor Eficientizado (KWh)	Valor Economizado	Meta de Economia	Bonificação de Desempenho Energético
mar/25	31	0,26261905	0,23	0,49261905	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	96873,72
abr/25	30	0,26255814	0,23023256	0,4927907	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	93781,42
mai/25	31	0,26596492	0,22491229	0,49087721	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	96531,18
jun/25	30	0,27791667	0,20583334	0,48375001	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	92060,92
jul/25	31	0,27468086	0,20340426	0,47808512	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	94015,61
ago/25	31	0,27206897	0,20137932	0,47344829	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	93103,78
set/25	30	0,27955556	0,20688889	0,48644445	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	92573,69
out/25									
nov/25									
dez/25	31	0,27805346	0,20587003	0,48392349	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	95163,73
jan/26	31	0,27695168	0,20505577	0,48200745	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	94786,94
fev/26	28	0,2566309	0,20505577	0,46168667	1817330,077	430899,224	R$ 1.386.430,85	R$ 1.090.398,05	82004,64
mar/26	31	0,27456411	0,20328206	0,47784617	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	93968,62
abr/26	30	0,27767155	0,20558597	0,48325752	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	91967,19
mai/26	31	0,28919033	0,20410323	0,49329356	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	97006,36
jun/26	30	0,31685422	0,2046752	0,52152942	1947139,368	461677,74	R$ 1.485.461,63	R$ 1.168.283,62	99250,60
jul/26	31	0,31218845	0,20165958	0,51384803	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	101048,40
ago/26	31	0,31536292	0,20371153	0,51907445	2012044,014	477066,998	R$ 1.534.977,02	R$ 1.207.226,41	102076,18
set/26				0	0	0	R$ -	R$ -	0,00

5 Receita Acessória – 4º Aditamento Contratual

Os valores mensais referentes aos links de internet estão sendo recebidos regularmente, permanecendo pendente apenas o pagamento dos valores retroativos. O tema foi tratado nas reuniões mensais realizadas em junho de 2026, nas quais ficou acordado que os valores retroativos serão contemplados em futuro processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme os mecanismos contratuais aplicáveis.

6 Usinas Fotovoltaicas

No que se refere às Usinas Fotovoltaicas, informa-se que as unidades instaladas no Centro de Reabilitação e no SAMU permanecem em plena operação e em fase de geração de energia.

Adicionalmente, a CPFL autorizou a implantação das usinas fotovoltaicas nos seguintes locais:

- PMB – EM João Baroni;
- PM Barretos – CEMEI Jardim dos Coqueiros;
- EM Fausto Lex;
- PMB – CEMEI Cleuza Pereira Barreto;
- CEMEI Izadora Bevilacqua de Souza Merenda;
- CEMEI José Sebastião Domingos – CEMEI Vida Nova;
- PMB – CEMEI Tem Afonso Câmara Filho;

- CEMEI Elza Maria Pitta Bezerra – CEMEI Santa Cecília;
- EM Sagrados Corações;
- PMB – Parque Infantil;
- CEMEI Luzia Costa Fernandes – CEMEI Califórnia;
- PMB – EM Anália Franco;
- PMB – EM Prof. Dorotóvio Nascimento;
- PMB – EMEI Ana Carvalho Castanho;
- CEMEI Anna Kerulis da Silveira;
- PMB – Unidade Integrada Pimenta; e
- PMB – EM Prof. Giuseppe Carnimeo.

Com a liberação dos novos pontos pela CPFL, a Concessionária encontra-se elaborando o cronograma de execução, que deverá ser concluído e apresentado no início da próxima semana, contemplando o planejamento para o início das obras de implantação das novas unidades.

A Concessionária permanece à disposição para dar prosseguimento às providências necessárias e informará a evolução das obras conforme as etapas previstas no cronograma.

PMB EM JOAO BARONI
PM BARRETOS CEMEI JARDIM DOS COQUEIROS
EM FAUSTO LEX
PMB CEMEI CLEUZA PEREIRA BARRETO
CEMEI IZADORA BEVILACQUA DE SOUZA MERENDA
CEMEI JOSE SEBASTIAO DOMINGOS - CEMEI VIDA NOVA
PMB CEMEI TEM AFONSO CAMARA FILHO
CEMEI ELZA MARIA PITTA BEZERRA (CEMEI SANTA CECILIA)
EM SAGRADOS CORAÇÕES
PMB PARQUE INFANTIL
CEMEI LUZIA COSTA FERNANDES (CEMEI CALIFORNIA)
PMB EM ANALIA FRANCO
PMB PARQUE INFANTIL
PMB EM PROF DOROTOVIO NASCIMENTO
PMB EMEI ANA CARVALHO CASTANHO
CEMEI ANNA KERULIS DA SILVEIRA
PMB UNIDADE INTEGRADA PIMENTA
PMB EM PROF GIUSEPPE CANIMEO

Para ciência, o Termo de Referência, Anexo I do Contrato de Concessão, prevê o seguinte:

6 DA(S) USINA(S) FO T OVOLT AIC A(S) DE GERAÇÃO DISTR IBUÍDA (UFV)

6.1 Neste capítulo é apresentado o escopo do projeto de implantação, operação e manutenção de uma UFV de geração distribuída que deverá ser implantada em local do PODER CONCEDENTE, para suprir parcialmente a demanda energética das edificações públicas mun icipa is . A projeção total de geração de energia elétrica da UFV de geração distribuída é de no mínimo 5 . 855 . 970 , 04 kWh (cinco milh ões, oitocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e s etenta inteiros e quatro centés imos).

6.2 A CONCESSIONÁRIA poderá selecionar outro local para instalação da UFV, mediante aprovação do PODER CONCEDENTE, desde que as inf or mações do Par ecer de Acesso emitido pela distr ibuidor a local indiquem a inviabilidade do local selecionado.

6. 1. 2. Memorial Descritivo

.....

A UFV poderá ser instalada em solo ou em telhados atr avés de estruturas metálicas, com inclinação em relação ao horizonte e desvio do Norte

geogr áfico a serem definidos. Ela é composta por módulos solares ligados em s ér ie/par alelo . . . . . .

Lembramos que o CMOG, em seu Relatório de Desempenho da Concessionária encaminhado em 24/10/24, cita em seu item 5:

O Poder Concedente autoriza os estudos a fim de que as placas fotovoltaicas sejam nos telhados dos prédios públicos.

O Poder Concedente pediu parecer ao Verificador Independente em 6/março/25 sobre as instalações de placas fotovoltaicas em telhados, cuja resposta foi enviada em 17/março/25.

7 Telegestão

A instalação do sistema de telegestão foi concluída em aproximadamente 21 mil pontos devido a retirada de praças que entra em conflito com as contatoras que matem os refletores ligados no período ajustado, encontrando-se em pleno funcionamento, com aplicação de dimerização que inicio em priemiro de setembro sendo realizada com 50% incialmente para observamos o resultado em relação a segurança. Ficou alinhado que a Prefeitura poderá indicar locais e horários específicos para otimização do consumo energético.

8 Pontos de Wi-Fi

Informa-se que todos os pontos de Wi-Fi previstos contratualmente se encontram em pleno funcionamento, atendendo regularmente às condições e aos parâmetros estabelecidos no contrato. As ocorrências anteriormente identificadas foram solucionadas há tempo, não havendo, no período atual, registro de pontos inoperantes ou de pendências relacionadas à prestação do serviço.

A Concessionária realiza testes operacionais e as validações necessárias, de modo a assegurar a normalização e a estabilidade do sistema após a conclusão das instalações, conforme evidenciado nos registros anexos.

9 Expansão do Parque de Iluminação

O Contrato de Concessão estabelece meta anual de expansão de 219 pontos. No exercício de 2025, essa meta foi superada, totalizando 279 novos pontos instalados.

O quantitativo excedente de 60 unidades ultrapassa a meta contratual originalmente prevista para o período. Conforme alinhamento realizado com o Poder Concedente, esse excedente foi **reprogramado para o exercício de 2026**, passando a compor a meta física do referido ano.

Dessa forma, o exercício de 2026 foi iniciado já com a **incorporação dos pontos excedentes provenientes de 2025**, conforme demonstrado na tabela a seguir, refletindo a antecipação de metas e a continuidade do plano de expansão.

Ressalta-se que essa reprogramação não configura ampliação contratual imediata, mas sim a **realocação de metas previamente executadas**, com posterior formalização por meio dos instrumentos administrativos cabíveis, assegurando a adequada compatibilização do cronograma físico-financeiro da concessão.

Novas demandas de expansão permanecem sujeitas à análise técnica e deliberação da Secretaria de Obras, observando os critérios de priorização e planejamento municipal.

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA - Atendimento a Expansões															
previso/realizado	2025	2025												%	Qtde.
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
PREVISTO EXPANSÕES	219	219 - crescimento anual												100%	219
REALIZADO	287	95	27	17	0	0	6	0	23	111	0	8	0	131,1%	287

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA - Atendimento a Expansões															
previso/realizado	2026	2026												%	Qtde.
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
PREVISTO EXPANSÕES	219	219 - crescimento anual												100%	219
REALIZADO	131	38	17	27	10	12	3	13	11					59,8%	131

Acompanhamento das Expansões – Exercício 2026

Conforme cronograma de referência para atendimento às expansões previsto para o exercício de 2026, a meta anual estabelecida corresponde a 219 pontos.

Assim, os pontos implantados além da meta anual deverão ser objeto de apuração individualizada e correspondente cobrança por ponto adicional executado, considerando os custos de materiais, mão de obra, mobilização, equipamentos e demais impactos operacionais, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

9.a Qualitativo implantado – Indicadores de Iluminação Pública

No mês de agosto foram feitas as aferições referentes às modernizações realizadas no trimestre.

Total de aferições: 315

Com a presença do VI: 50

Somente Concessionária: 265

b. Demanda Reprimida da Iluminação Pública

Não foram realizadas demandas reprimidas em agosto

c. Descarte de lâmpadas

No mês de Agosto não tivemos descarte de materiais.

O Relatório de Modernização que extraímos de nosso Sistema e encaminhado mensalmente ao Verificador Independente e ao Poder Concedente apresenta resumidamente para o período de **Janeiro de 2024 a Agosto de 2026** o seguinte quadro ao qual estamos contabilizando:

resumo modernização até Agosto/26	
Total de Pontos Luminosos EDITAL	23.615
Total de Pontos Modernizados:	23735
Redução de Pontos	2417
Pontos instalados LED	21318
Percentual Modernizado no período	100,51%
Percentual Redução de Carga:	75,99%
Carga anterior (kWatt)	5698,19
Carga instalada (kWatt)	1367,898

10. IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – 36 LOCAIS E META CONTRATUAL DE 535 PONTOS

Em decorrência das inviabilidades técnicas e operacionais identificadas em parte dos pontos de destaque originalmente previstos, foi acordada com o Poder Concedente a substituição desses pontos pela implantação de novos pontos de iluminação em locais equivalentes, especialmente nos entornos dos lagos do município, assegurando o cumprimento da meta contratual e a equivalência técnica das intervenções.

As obras tiveram início no final do mês de dezembro e avançaram gradativamente, com a implantação e entrada em operação das diferentes frentes de serviço.

Após a consolidação e validação dos serviços realizados, foram acrescentados 118 pontos aos 424 anteriormente contabilizados, totalizando 542 pontos de iluminação de destaque executados.

Considerando que a meta contratual corresponde a 535 pontos, verifica-se que o escopo foi integralmente cumprido, com superação de 7 pontos em relação ao quantitativo previsto.

A atualização contempla os novos pontos implantados nos entornos dos lagos, na Praça do Japonês/Nory, na frente do Recinto Paulo de Lima Corrêa, no Boi Soberano, nos decks, na quadra e em outras estruturas de iluminação, incluindo postes, gaiolas e refletores devidamente executados e contabilizados.

Esclarece-se que as intervenções realizadas no interior do Recinto Paulo de Lima Corrêa não foram consideradas no quantitativo da iluminação de destaque, sendo contabilizados somente os pontos executados na área frontal do Recinto.

Dessa forma, fica substituída a informação anteriormente apresentada de 424 pontos executados e 112 pontos remanescentes, uma vez que a consolidação atual demonstra o cumprimento integral da meta contratual.

Ressalta-se, por fim, que as adequações realizadas preservam a finalidade e a equivalência técnica do escopo contratado e não impactam os critérios de cálculo da Bonificação de Desempenho Energético (BDE), permanecendo válidos os parâmetros técnicos e metodológicos já aprovados.

Em decorrência das inviabilidades técnicas e operacionais identificadas em parte dos pontos de destaque originalmente previstos, foi acordada, junto ao Poder Concedente, a substituição desses pontos pela implantação de novos pontos de iluminação nos entornos dos lagos do município, assegurando o cumprimento das metas contratuais e a equivalência técnica das intervenções.

As obras tiveram início no final do mês de dezembro, encontrando-se, até a presente data, em fase avançada de execução, com frentes de serviço já implantadas e em operação parcial.

Ressalta-se que a execução dos serviços segue o cronograma ajustado, sendo que, no próximo mês, será apresentada tabela comparativa contendo o detalhamento dos pontos executados, substituídos e remanescentes, de forma a permitir o acompanhamento técnico e administrativo da evolução do escopo.

11 -IMPLANTAÇÃO DA INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – 115 PRÉDIOS

Concluímos 148 links de internet (alguns prédios estão com backup) superando em 28,69% o previsto de 115 conexões, o que será motivo de reequilíbrio econômico-financeiro-REF.

12 -IMPLANTAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO – 84 CÂMERAS

As instalações e as conexões das 84 câmeras ao CCO de Segurança da Prefeitura em 41 pontos distintos na cidade foram concluídas.

As pendências de gravação de 30 dias de armazenamento de imagens foram solucionadas e temos pleno cumprimento do contrato.

13- Monitoramento Rural

No âmbito do projeto de monitoramento rural do município, informa-se que a implantação teve início na região da Cachoeirinha (Capela São Sebastião), ponto 42, com a instalação da infraestrutura necessária à operação do sistema e a ativação de duas câmeras LPR, em operação desde 04/03/2026 e 19/03/2026.

Na sequência do cronograma, foram realizados avanços no Distrito de Alberto Moreira, com a implantação de pontos de monitoramento em dois locais — Avenida 5 com Rua 10 (acesso aos ranchos), ponto 43, e Silo da Coopercitrus, na Rodovia Vicinal Nadir Kenan, ponto 44 —, ambos em operação desde 06/04/2026. Posteriormente, foi implantado o ponto 45, em Contendas (estrada de saída para Pau Impé), em operação desde 20/04/2026.

A etapa seguinte contemplou a região de Ibitu, com a implantação de dois pontos de monitoramento — entrada de Contendas, na Avenida Jorge Tibiriçá, ponto 46, e Vicinal Três Barras, ponto 47 —, ambos em operação desde 09/05/2026.

Atualmente, as frentes de serviço encontram-se direcionadas às localidades de Brejinho (cruzamento), ponto 48, e Adolfo Pinto (igreja), onde já foi concluída a implantação dos postes em 15/04/2026, seguindo-se as etapas de ativação. Na sequência do cronograma estão previstas as localidades de Prata, Água Limpa, Três Barras, Lagoinha, Palmar, Pau Impé e Estrada de Guaíra, com o objetivo de ampliar a cobertura de segurança e apoiar as ações de vigilância no município.

14 CAMERAS FACIAIS

Em atendimento ao Ofício nº 121/2026 – SMOP, de 8 de maio de 2026, a Concessionária informa que se encontra em andamento o projeto de implantação de câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial.

O projeto compreende o levantamento técnico dos locais indicados, a implantação da infraestrutura necessária, a instalação e configuração dos equipamentos, a integração com o sistema existente e a realização de testes operacionais, com o objetivo de assegurar o pleno funcionamento da solução.

As atividades estão sendo executadas de forma gradual, considerando as condições técnicas e operacionais específicas de cada local. O andamento das instalações e a situação atual dos pontos contemplados estão apresentados na tabela a seguir.

Local	Ponto	Situação
UPA – Via Conselheiro Antônio Prado	F2	Instalado e operando com leitura facial
Terminal Rodoviário – acesso pela Rua 32	F3	Instalado e operando com leitura facial
Terminal Rodoviário – plataformas de embarque e desembarque	F4	Instalado e operando com leitura facial
Santa Casa – entrada pela Avenida 23	F5	Em fase de implantação, conforme cronograma técnico
Santa Casa – entrada pela Rua 30	F6	Em fase de implantação, conforme cronograma técnico

A Concessionária permanece acompanhando a execução das atividades e adotando as providências necessárias para a conclusão das instalações, adequação dos pontos pendentes e plena operacionalização do projeto

15 CONCLUSÃO

No período avaliado, foi mantida a continuidade das atividades de operação e manutenção do parque de iluminação pública, com a realização de rondas periódicas para verificação do estado geral do parque, execução das manutenções corretivas e preventivas necessárias e planejamento das próximas atividades, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato de Concessão.

Ressalta-se que a pendência remanescente refere-se à implantação da telegestão no distrito, cuja execução está prevista para a próxima etapa do cronograma.

O sistema encontra-se em pleno funcionamento na área urbana, permitindo o monitoramento individualizado do consumo energético, o registro de horas de funcionamento, a detecção de falhas em tempo real e a gestão remota de cada ponto de iluminação, contribuindo diretamente para a eficiência operacional e energética do parque.

A funcionalidade de dimerização (redução automática da potência luminosa em períodos específicos) já está disponível e será configurada em etapas, conforme definição conjunta com o Poder Concedente, visando ampliar a eficiência energética e reduzir o consumo.

Em março/24 tivemos o início da modernização da iluminação pública em maior escala avançando por todos os bairros da cidade atingindo no final de maio o total de 21.278 luminárias LED instaladas em substituição a 23.685 luminárias modernizadas, portanto redução de 2.407 luminárias no parque de iluminação, contribuindo para a redução do consumo de energia.

A modernização até 31/10/25 de **23.714** luminárias representa **100,42%** da meta do Edital de **23.615** luminárias, superando em 70 luminárias. No cadastro atualizado temos o total de no parque de IP com 23.375 luminárias e projetores incluindo praças, rotatórias, destaque e vias públicas.

Importante frisar que todas as substituições de luminárias seguem projetos luminotécnicos elaborados em conformidade com a NBR 5101/2018 conforme consta em contrato. Os projetos têm indicado que, mesmo com a redução de luminárias em diversos pontos, temos uma melhoria acentuada de iluminância e uniformidade proporcionando aos munícipes mais segurança e conforto além de contar com índices de defeitos em luminárias LED baixíssimos, menos de 0,5%, diferente das luminárias com lâmpadas de descarga cujos índices estão próximos de 5%.

Resumidamente, atendimentos realizados

Manutenção 01 a 31 Agosto	
OS atendidas por canais no prazo	47
OS atendidos canais fora do prazo	0
OS atendidas por ronda	42
OS atendidas avulso	15
OS Modernização	1
OS telegestão	215
Total	320
Média tempo de atendimento canais	**37:12:55**
OS pendentes canais no prazo	0
OS pendentes canais vencidas	0
OS pendentes ronda	0
Total	0
Ronda feita ate 10/01	6350
Defeitos encontrados ronda	423
Percentual	6,66%

Dessa forma, as Notas Fiscais referentes aos serviços passaram a ser emitidas com base na PRM reajustada, observadas as condições estabelecidas. Quanto à parcela das usinas solares fotovoltaicas, correspondente a 32,26% da PRM, que até então permanecia excluída do faturamento nos termos do Ofício CMOG nº 029/2024, de 27/03/2024, o faturamento foi retomado de forma proporcional ao percentual efetivamente implantado, entregue e em operação, conforme a estrutura de remuneração do 3º Marco.

Ressalta-se que, adicionalmente à PRM, foi realizada a medição e faturamento da Bonificação de Desempenho Energético (BDE), conforme critérios contratuais vigentes e parâmetros técnicos previamente aprovados.

No período, foram emitidas as seguintes Notas Fiscais:

Nota Fiscal	Valor	Descrição
NF nº 72	R$ 126.067,81	Serviços de videomonitoramento
NF nº 73	R$ 481.911,43	Serviços de iluminação pública
NF nº 74	R$ 6.228,87	Serviços de geração de energia fotovoltaica, referentes ao mês de agosto de 2026, correspondente ao percentual de 32,26%
NF nº 75	R$ 39.420,04	Segunda de três parcelas do valor retroativo decorrente do reajuste anual de 4,264380% pelo IPCA, referente aos serviços de iluminação pública
NF nº 76	R$ 10.312,26	Segunda de três parcelas do valor retroativo decorrente do reajuste anual de 4,264380% pelo IPCA, referente aos serviços de videomonitoramento
NF nº 77	R$ 102.076,18	Parcela da Bonificação por Desempenho Energético (BDE), referente à competência de agosto de 2026
Total	**R$ 766.016,59**	**Valor total das Notas Fiscais emitidas no período**

ANEXO I

Regularidade FGTS

02/09/2026, 14:49 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	49.023.977/0001-13
Razão social:	IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A
Endereço:	AV SEICHO-NO-IE 420 / DISTRITO INDUSTRIAL / BARRETOS / SP / 14783-033

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/08/2026 a 18/09/2026

Certificação Número: 2026082007246109664609

Informação obtida em 02/09/2026 14:49:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

BARRETOS INTELIGENTE

ANEXO II

Regularidade Trabalhista E Previdenciária

BARRETOS INTELIGENTE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.023.977/0001-13
Certidão nº: 74108779/2026
Expedição: 02/09/2026, às 14:51:56
Validade: 01/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.023.977/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

BARRETOS INTELIGENTE

ANEXO III

Regularidade Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.023.977/0001-13

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26090339571-09
Data e hora da emissão	02/09/2026 14:53:52
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

BARRETOS INTELIGENTE

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 27176/2026

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de BARRETOS, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **49.023.977/0001-13** (CNPJ)

Contribuinte: **IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A**

Endereço: **AV SEICHO NO IE 420**
DISTRITO INDUSTRIAL I

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de BARRETOS de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

BARRETOS (SP), 02 de setembro de 2026.

Certidão emitida com base no(a) Decreto 11.638 de 27 de Fevereiro de 2023.

Certidão válida até 02/10/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço https://barretos.sp.gov.br.
Certidão emitida em 02/09/2026 as 14:46:00h. - Código de Validação **U7O4A2.S7L6U7.D8T7Z5**

AVENIDA. ALMIRANTE GAGO COUTINHO, nº 500 - BARRETOS - SP - CEP 14783-200 - Fone: (17) 3612-2000
CNPJ 44.780.609/0001-04 - e-mail: cidadaoonline@barretos.sp.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IP BARRETOS CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A
CNPJ: 49.023.977/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:46 do dia 02/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2027.
Código de controle da certidão: **1AAA.328C.3904.0444**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
